



Modèle DAAT n°02-20-A

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ». Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Références réglementaires :

Articles R. 4412-97 à R4412-97-6 du code du travail.

Décret n°2017-899 du 09 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, modifiés par le décret N°2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Bien objet de la mission :

ESI :	1109L			
Bâtiment :	Bâtiment I			
Adresse :	13-15-17 rue Rodin 91380 CHILLY-MAZARIN			
Propriétaire / donneur d'ordre :	IMMOBILIERE 3F 159 rue nationale 75638 PARIS CEDEX 13			
Programme de travaux :	Voir liste des travaux au chapitre 5			
Date de commande :	02/02/2021			
Date de rapport	N° de version	Opérateurs de repérage	Rédacteur	Validation
26/03/2021	1	Julien DETOUL Certificat délivré par ICERT CPDI 5590 V002 délivré le 17/06/2020 et expirant le 16/06/2027 Antoine MIRANDE Certificat délivré par ICERT CPDI 5627 V003 délivré le 07/07/2020 et expirant le 06/07/2027	Julien DETOUL 	Matthieu PAUVERT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :	17
4.	Réalisation du repérage	22
5.	Nature et périmètre des travaux envisagés.....	24
6.	Attestation d'assurance	25
7.	Certificat de compétences	26
8.	Rapports d'analyse.....	29

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INNAX
Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
Numéro SIRET : 439 685 421 000 75
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu'au : 31/12/2021

1.2. Information sur le bâtiment

Date de permis de construire ou, le cas échéant, date de construction : 1962
Fonction principale du bâtiment : Habitations
Autre renseignement : -

1.3. Programme et périmètre de repérage

Localisation des travaux envisagés : **Ensemble du bâtiment I**
Délimitation de la zone concernée par la mission : **Ensemble du bâtiment I**
Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	X
Ardoises, bardeaux bitumineux	X
Éléments associés à la toiture	X
Éléments sous toiture	X
Étanchéité de toiture terrasse	X
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	X
Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	X
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	X
Façades lourdes y compris poteaux	X
Menuiseries extérieures	X
Éléments associés aux façades	X
Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	X
Poteaux	X
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	X

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Gaines et coffres verticaux	X
Portes coupe-feu, pare-flamme, iso thermiques, frigorifiques	X
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	X
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	X
Poutres et charpentes	X
Gaines et coffres horizontaux	X
Faux plafonds	X
Suspentes et contrevents	X
Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	X
Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	X
Clapets / volets coupe-feu	X
Vide-ordures	X
Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	
Parois des équipements	
Matériels en machinerie	
Equipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	
Convecteurs et radiateurs électriques	
Fusibles à broche	
Canalisations électriques préfabriquées	
Coffres forts	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	X
Jardinières, bac à sable incendie	
Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	
Parois verticales et horizontales enterrées	
Conduits et fourreaux	
Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	X
Voiries	
Espaces sportifs	
Aménagements extérieurs	X

1.4. Rapports précédents

Type de rapport	Référence du rapport	Conclusion
Néant		

1.5. Historique des visites réalisées

Date de la visite	Intervenants	Objet
16/02/2021	M.DETOUL	Diagnostic initial des parties communes
03/03/2021	M.MIRANDE M.MUTANTU	Diagnostic initial des parties privatives

1.6. Désignation du laboratoire d'analyse

Nom :	ITGA	ITGA	ITGA	ITGA
Adresse :	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 35768 ST GREGOIRE Cedex	15 Route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX	Parc d'affaires Espace Performance - Bât. K 35760 ST GREGOIRE Cedex	Arteparc - Bât. E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL
Accréditation	1-5967	1-5969	1-5970	1-1029

1.7. Obligation du donneur d'ordre

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

1.8. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2019 représente la base du repérage.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

- ✖ En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- ✖ Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- ✖ Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- ✖ Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

2. Conclusions du rapport


L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

PARTIES COMMUNES					
Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Toiture	Sortie de toiture	Chapeaux de conduit en fibrociment (sur décision de l'opérateur)	Bon état	1 U	
Toiture	Sortie de toiture	Base en fibrociment (sur décision de l'opérateur)	Bon état	4 U	
R-1	Local ordures ménagères	Conduit de vide-ordures en fibrociment (Par ZPSO D/P35 et L/P35)	Bon état	3 U	

PARTIES PRIVATIVES					
Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Ensemble des logements du dernier étage	Celliers	Conduit en fibrociment (partie haute du conduit) <i>(sur décision de l'opérateur)</i>	Bon état	6 U	
Logements 1109L-0140 1109L-0146 1109L-0152 Cuisine, salle d'eau, WC	WC Sol	Colle de carrelage gris 10x10 <i>(I-0140/P09 ; I-0146/P10 ; I-0152/P08)</i>	Bon état	10 m² / logement	
Ensemble des logements (sauf ceux identifiés au paragraphe 2.2)	Sous-face évier (*)	Revêtement bitumineux <i>(I-0149/P07 ; I-0155/P07)</i>	Bon état	1 U / logement	
Logement 1109L-0149 Cuisine	Mur	Colle de faïence <i>(I-0149/P08)</i>	Dégradé	Environ 3 m²	

Remarque :

(*) : A la vue des résultats sur l'ensemble du site, les enduits bitumineux des éviers d'origine contiennent de l'amiante. Certains ont pu être remplacés ponctuellement. Ils sont listés au paragraphe 2.2.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.2. Résultats détaillés par logement

Le tableau ci-après répertorie le détail des résultats logement par logement.

Il ne porte que sur les :

- Revêtements de sol / plinthes
- Enduits muraux et plafond
- Colles de faïence
- Eléments sous évier et baignoire
- Joints de vitrage et d'étanchéité

LEGENDE :

- Non démontable : Présence potentielle d'une plaque sous baignoire inaccessible sans démontage destructif du tablier et/ou déménagement des meubles de salles de bains.
- **AMIANTE** : Prélèvement avec amiante
- Pas d'amiante :
 - o Prélèvement sans amiante ou selon ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages)
 - o Absence du matériau recherché
 - o RECENT (>2000) : matériau posé après 2000 non susceptible de contenir de l'amiante.
En général en très bon état entraînant un refus de dégradation pour prélèvement de la part du locataire.
 - o NON Visité : locataire absent aux jours de visite
 - o REFUS : Refus du locataire d'accéder à son logement

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	Sol 1	Locaux	Matériaux	Sol 2	Locaux	Matériaux
1109-0137	Non															
1109-0138	Non															
1109-0139	Non															
1109-0140	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence grise 20x20	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence beige 20x25	Absence	Absence (douche)	Carrelage gris 10x10	AMIANTE	Cuisine- SDB- WC	Carrelage gris 10x10			
1109-0141	Non															
1109-0142	Non															
1109-0143	Non															

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	Sol 1	Locaux	Matériaux	Sol 2	Locaux	Matériaux
1109-0144	Non															
1109-0145	Non															
1109-0146	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 20x20	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence grise 15x20	Absence	Absence d'amiante - Après analyse	Carrelage gris 10x10	AMIANTE	Cuisine-SDB-WC	Carrelage gris 10x10			
1109-0147	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Refus du locataire	Faïence blanche 15x15	Refus du locataire	Faïence blanche 15x15	Absence d'amiante - Après analyse	Absence (douche)	Carrelage gris 10x10	Refus du locataire	Cuisine	Carrelage blanc 15x15	Refus du locataire	SDB, WC	Carrelage bleu 15x15
1109-0148	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Non prélevé (récent)	Faïence à motif 10x10	Non prélevé (récent)	Faïence noire 15x20	Absence	Non démontable (tablier faïencé)	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cellier, Cuisine	Carrelage gris 20x20	Refus du locataire	SDB	Carrelage noir 20x20
1109-0149	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	AMIANTE	Faïence blanche 10x10	ZPSO cuisine	Faïence blanche 10x10	AMIANTE	Absence	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine-SDB-WC	Carrelage gris 10x10			
1109-0150	Non															
1109-0151	Non															
1109-0152	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence grise 20x20	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence bleue et rose 20x25	Absence	Absence	Carrelage gris 10x10	AMIANTE	Cuisine-SDB-WC	Carrelage gris 10x10			
1109-0153	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	ZPSO SDB	Faïence blanche 15x15	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 15x15	Absence	Absence d'amiante - Après analyse	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine-SDB-WC	Carrelage gris 10x10			
1109-0154	Non															
1109-0155	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 10x10	ZPSO cuisine	Faïence blanche 10x10	AMIANTE	Absence	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine-SDB-WC	Carrelage gris 10x10			
1109-0156	Non															



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	Sol 1	Locaux	Matériaux	Sol 2	Locaux	Matériaux
1109-0157	Non															
1109-0158	Non															
1109-0159	Non															
1109-0160	Non															

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.3. Liste des prélèvements effectués contenant de l'amiante

PARTIES COMMUNES				
DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Néant				

PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
I-0140-P09	Colle de carrelage-Sol	13 rue Rodin	1109L-0140	WC	Amiante détecté
I-0146-P10	Colle de carrelage-Sol	15 rue Rodin	1109L-0146	WC	Amiante détecté
I-0149-P07	Revêtement bitumineux-Evier	15 rue Rodin	1109L-0149	Cuisine	Amiante détecté
I-0149-P08	Colle de faïence-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0149	Cuisine	Amiante détecté
I-0152-P08	Colle de carrelage-Sol	15 rue Rodin	1109L-0152	WC	Amiante détecté
I-0155-P07	Revêtement bitumineux-Evier	17 rue Rodin	1109L-0155	Cuisine	Amiante détecté

2.4. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Conduits de ventilations des logement en béton brut	Gaine de ventilations logements
Conduits EU / EP en métal	Logements

Marquage ou documents techniques :

Description	Localisation	Justification
-		

Information relative à un précédent rapport :

Description	Localisation

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Après analyse en laboratoire :

PARTIES COMMUNES				
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Toiture/P09	Revêtement étanchéité + couche isolant	Bâtiment I - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P10	Revêtement étanchéité + isolant type mousse	Bâtiment I - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P11	Revêtement bitumineux pare vapeur	Bâtiment I - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P12	Remontée d'étanchéité pax alu	Bâtiment I - Toiture-terrasse	Mur	Amiante non détecté
I/P01	Colle de carrelage + peinture	Bâtiment I - extérieur	Façade avant	Amiante non détecté
I/P02	Colle de carrelage + peinture	Bâtiment I - extérieur	Façade arrière	Amiante non détecté
I/P03	Enduit + peinture + isolant sur ITE	Bâtiment I - extérieur	Pignon gauche	Amiante non détecté
I/P04	Enduit + peinture + isolant sur ITE	Bâtiment I - extérieur	Pignon droit	Amiante non détecté
I/P05	Enduit + peinture	Bâtiment I - extérieur	Sous-face porche	Amiante non détecté
I/P06	Joint de dilatation	Bâtiment I - extérieur	Façade avant	Amiante non détecté
I/P07	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 13	Mur RDC	Amiante non détecté
I/P08	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 13	Plafond RDC	Amiante non détecté
I/P09	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 13	Sous-face escalier RDC	Amiante non détecté
I/P10	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 13	Mur R+2	Amiante non détecté
I/P11	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 13	Plafond r R+2	Amiante non détecté
I/P12	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 13	Sous-face escalier R+2	Amiante non détecté
I/P13	Peinture	Bâtiment I - entrée 13	Garde-corps RDC	Amiante non détecté
I/P14	Enduit	Bâtiment I - entrée 13	Mur cave	Amiante non détecté
I/P15	Fibralith	Bâtiment I - entrée 13	Plafond cave	Amiante non détecté
I/P16	Calorifuge	Bâtiment I - entrée 13	Plafond R-1	Amiante non détecté
I/P17	Enduit	Bâtiment I - entrée 13	Mur gaine technique R-1	Amiante non détecté
I/P18	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 13	Mur local OM	Amiante non détecté
I/P19	Fibralith	Bâtiment I - entrée 13	Plafond local OM	Amiante non détecté
I/P20	Peinture	Bâtiment I - entrée 13	Sol local OM	Amiante non détecté
I/P21	Tampon bitumineux	Bâtiment I - entrée 13	Trappe local OM	Amiante non détecté
I/P22	Isolant type laine de verre	Bâtiment I - entrée 13	Trappe local OM	Amiante non détecté
I/P23	Joint sur conduit	Bâtiment I - entrée 13	Conduit vide-ordure local OM	Amiante non détecté
I/P24	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 15	Mur R+1	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

PARTIES COMMUNES				
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
I/P25	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 15	Plafond R+1	Amiante non détecté
I/P26	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 15	Sous-face escalier R+1	Amiante non détecté
I/P27	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 15	Mur R+3	Amiante non détecté
I/P28	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 15	Plafond R+3	Amiante non détecté
I/P29	Enduit + peinture	Bâtiment I - entrée 15	Sous-face escalier R+3	Amiante non détecté
I/P30	Peinture	Bâtiment I - entrée 15	Garde-corps R+3	Amiante non détecté
I/P31	Enduit	Bâtiment I - entrée 15	Mur cave	Amiante non détecté
I/P32	Fibralith	Bâtiment I - entrée 15	Plafond cave	Amiante non détecté
I/P33	Calorifuge	Bâtiment I - entrée 15	Plafond R-1	Amiante non détecté
I/P34	Enduit	Bâtiment I - entrée 15	Mur gaine technique R+3	Amiante non détecté

PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
I-0140-P01	Enduit + peinture-Mur	13 rue Rodin	1109L-0140	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0140-P02	Enduit + peinture-Cloison	13 rue Rodin	1109L-0140	WC	Amiante non détecté
I-0140-P03	Enduit + peinture-Plafond	13 rue Rodin	1109L-0140	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0140-P04	Enduit + peinture-Mur	13 rue Rodin	1109L-0140	Chambre 2	Amiante non détecté
I-0140-P05	Enduit + peinture-Cloison	13 rue Rodin	1109L-0140	Chambre 2	Amiante non détecté
I-0140-P06	Enduit + peinture-Plafond	13 rue Rodin	1109L-0140	Couloir	Amiante non détecté
I-0140-P07	Colle de faïence-Mur	13 rue Rodin	1109L-0140	Cuisine	Amiante non détecté
I-0140-P08	Colle de faïence-Mur	13 rue Rodin	1109L-0140	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0146-P01	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0146	Cuisine	Amiante non détecté
I-0146-P02	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0146	WC	Amiante non détecté
I-0146-P03	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0146	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0146-P04	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0146	Chambre 2	Amiante non détecté
I-0146-P05	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0146	Entrée	Amiante non détecté
I-0146-P06	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0146	Dégagement 1	Amiante non détecté
I-0146-P07	Plaque bitumineuse-Baignoire	15 rue Rodin	1109L-0146	Salle de bains	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
I-0146-P08	Colle de faïence-Mur	15 rue Rodin	1109L-0146	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0146-P09	Colle de faïence-Mur	15 rue Rodin	1109L-0146	Cuisine	Amiante non détecté
I-0147-P01	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0147	Cuisine	Amiante non détecté
I-0147-P02	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0147	WC	Amiante non détecté
I-0147-P03	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0147	Salle d'eau	Amiante non détecté
I-0147-P04	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0147	Chambre 1	Amiante non détecté
I-0147-P05	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0147	Séjour	Amiante non détecté
I-0147-P06	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0147	Entrée	Amiante non détecté
I-0147-P07	Plaque bitumineuse-Evier	15 rue Rodin	1109L-0147	Cuisine	Amiante non détecté
I-0147-P08	Colle de carrelage-Sol	15 rue Rodin	1109L-0147	WC	Amiante non détecté
I-0147-P09	Autres-Autres	15 rue Rodin	1109L-0147	Séjour	Amiante non détecté
I-0148-P01	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0148	Cuisine	Amiante non détecté
I-0148-P02	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0148	WC	Amiante non détecté
I-0148-P03	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0148	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0148-P06	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0148	Rangement 2	Amiante non détecté
I-0148-P05	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0148	Chambre 3	Amiante non détecté
I-0148-P04	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0148	Chambre 2	Amiante non détecté
I-0148-P07	Colle de carrelage-Sol	15 rue Rodin	1109L-0148	Cellier 1	Amiante non détecté
I-0148-P08	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0148	Cellier 1	Amiante non détecté
I-0149-P01	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0149	Cuisine	Amiante non détecté
I-0149-P02	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0149	WC	Amiante non détecté
I-0149-P03	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0149	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0149-P04	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0149	Entrée	Amiante non détecté
I-0149-P05	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0149	Chambre 2	Amiante non détecté
I-0149-P06	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0149	Chambre 1	Amiante non détecté
I-0149-P09	Colle de carrelage-Sol	15 rue Rodin	1109L-0149	WC	Amiante non détecté
I-0149-P10	Autres-Autres	15 rue Rodin	1109L-0149	Séjour	Amiante non détecté
I-0152-P01	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0152	Salle de bains	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



PARTIES PRIVATIVES

REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
I-0152-P02	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0152	WC	Amiante non détecté
I-0152-P03	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0152	Cuisine	Amiante non détecté
I-0152-P04	Enduit + peinture-Mur	15 rue Rodin	1109L-0152	Entrée	Amiante non détecté
I-0152-P05	Enduit + peinture-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0152	Dégagement 1	Amiante non détecté
I-0152-P06	Enduit + peinture-Plafond	15 rue Rodin	1109L-0152	Séjour	Amiante non détecté
I-0152-P07	Colle de faïence-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0152	Cuisine	Amiante non détecté
I-0152-P09	Autres-Baignoire	15 rue Rodin	1109L-0152	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0152-P10	Colle de faïence-Cloison	15 rue Rodin	1109L-0152	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0153-P01	Enduit + peinture-Mur	17 rue Rodin	1109L-0153	Cuisine	Amiante non détecté
I-0153-P02	Enduit + peinture-Cloison	17 rue Rodin	1109L-0153	WC	Amiante non détecté
I-0153-P03	Enduit + peinture-Plafond	17 rue Rodin	1109L-0153	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0153-P04	Enduit + peinture-Mur	17 rue Rodin	1109L-0153	Chambre 1	Amiante non détecté
I-0153-P05	Enduit + peinture-Cloison	17 rue Rodin	1109L-0153	Dégagement 1	Amiante non détecté
I-0153-P06	Enduit + peinture-Plafond	17 rue Rodin	1109L-0153	Chambre 2	Amiante non détecté
I-0153-P07	Plaque bitumineuse-Baignoire	17 rue Rodin	1109L-0153	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0153-P08	Colle de faïence-Mur	17 rue Rodin	1109L-0153	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0153-P09	Colle de carrelage-Sol	17 rue Rodin	1109L-0153	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0153-P10	Autres-Autres	17 rue Rodin	1109L-0153	Séjour	Amiante non détecté
I-0155-P01	Enduit + peinture-Mur	17 rue Rodin	1109L-0155	Salle de bains	Amiante non détecté
I-0155-P02	Enduit + peinture-Cloison	17 rue Rodin	1109L-0155	WC	Amiante non détecté
I-0155-P03	Enduit + peinture-Plafond	17 rue Rodin	1109L-0155	Cuisine	Amiante non détecté
I-0155-P04	Enduit + peinture-Mur	17 rue Rodin	1109L-0155	Chambre 1	Amiante non détecté
I-0155-P05	Enduit + peinture-Cloison	17 rue Rodin	1109L-0155	Entrée	Amiante non détecté
I-0155-P06	Enduit + peinture-Plafond	17 rue Rodin	1109L-0155	Chambre 2	Amiante non détecté
I-0155-P08	Colle de faïence-Mur	17 rue Rodin	1109L-0155	Cuisine	Amiante non détecté
I-0155-P09	Colle de carrelage-Sol	17 rue Rodin	1109L-0155	Cuisine	Amiante non détecté
I-0155-P10	Enduit + peinture-Mur	17 rue Rodin	1109L-0155	Cellier 1	Amiante non détecté
I-0155-P11	Revêtement de sol souple en lé + colle-Sol	17 rue Rodin	1109L-0155	Cellier 1	Amiante non détecté



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.5. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement	Photographie
Plaques sous baignoire	Salle de bains : baignoire des logements cités au 2.2	Non accessible sans démontage des tabliers de baignoire (non démontable)	-

2.6. Obligations réglementaires

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.


Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux




3. Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

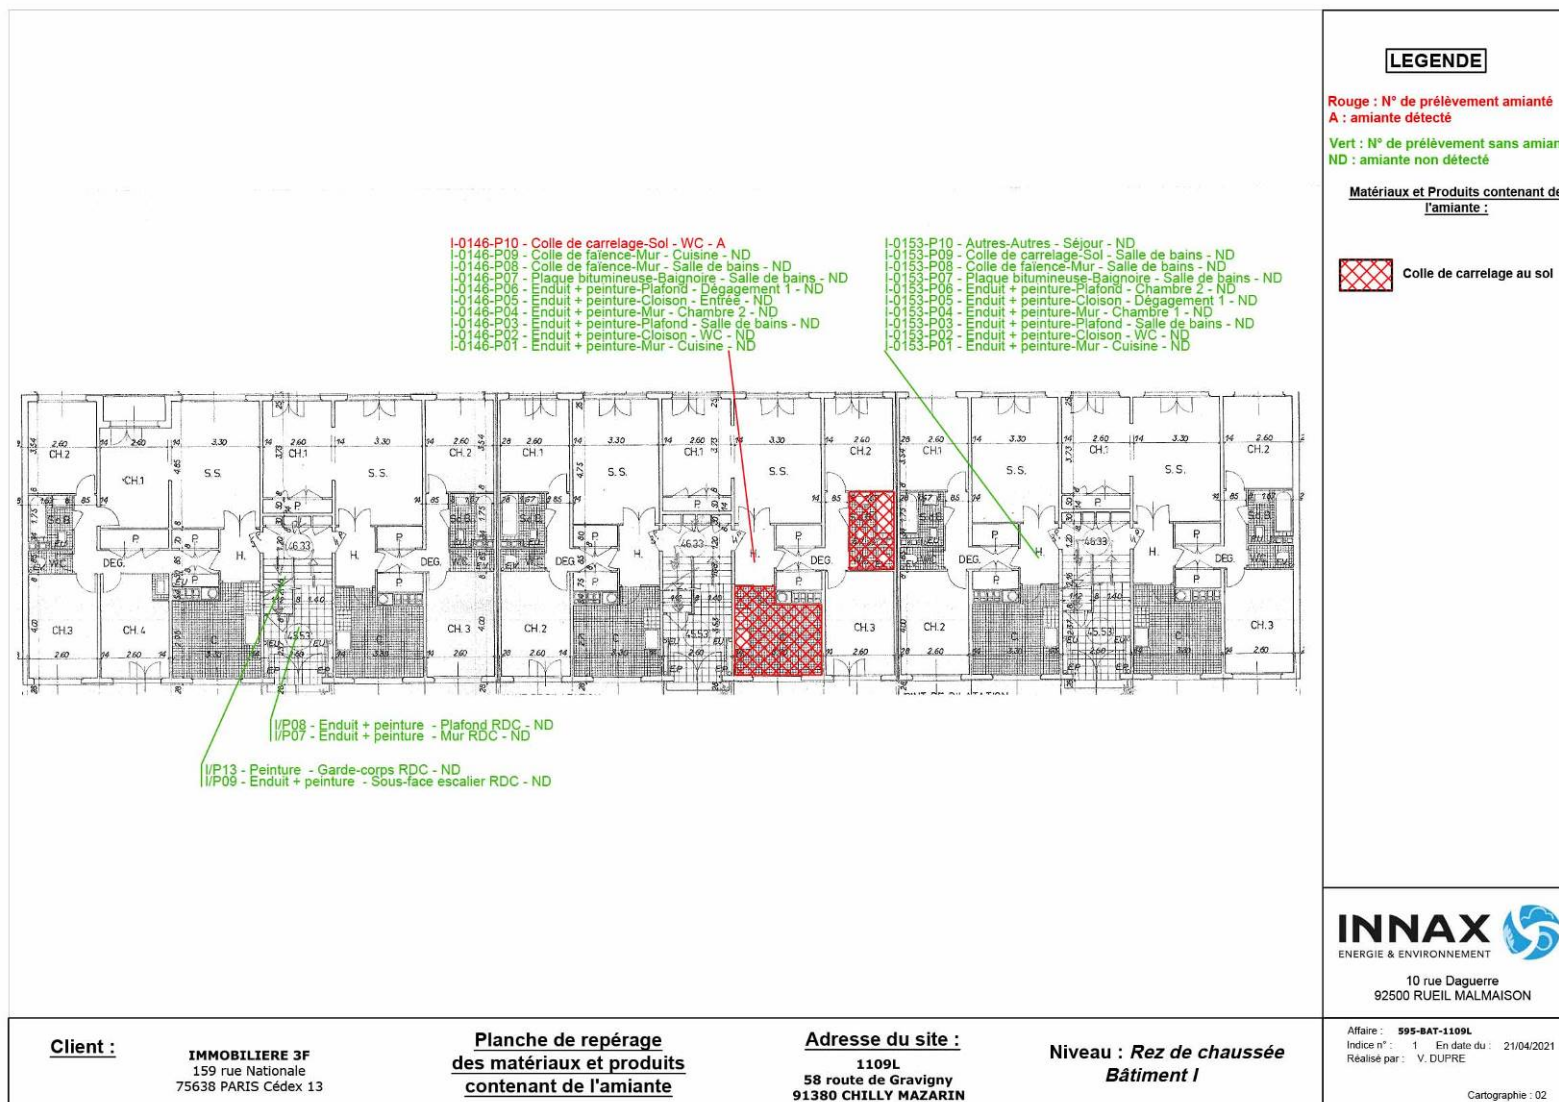


Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

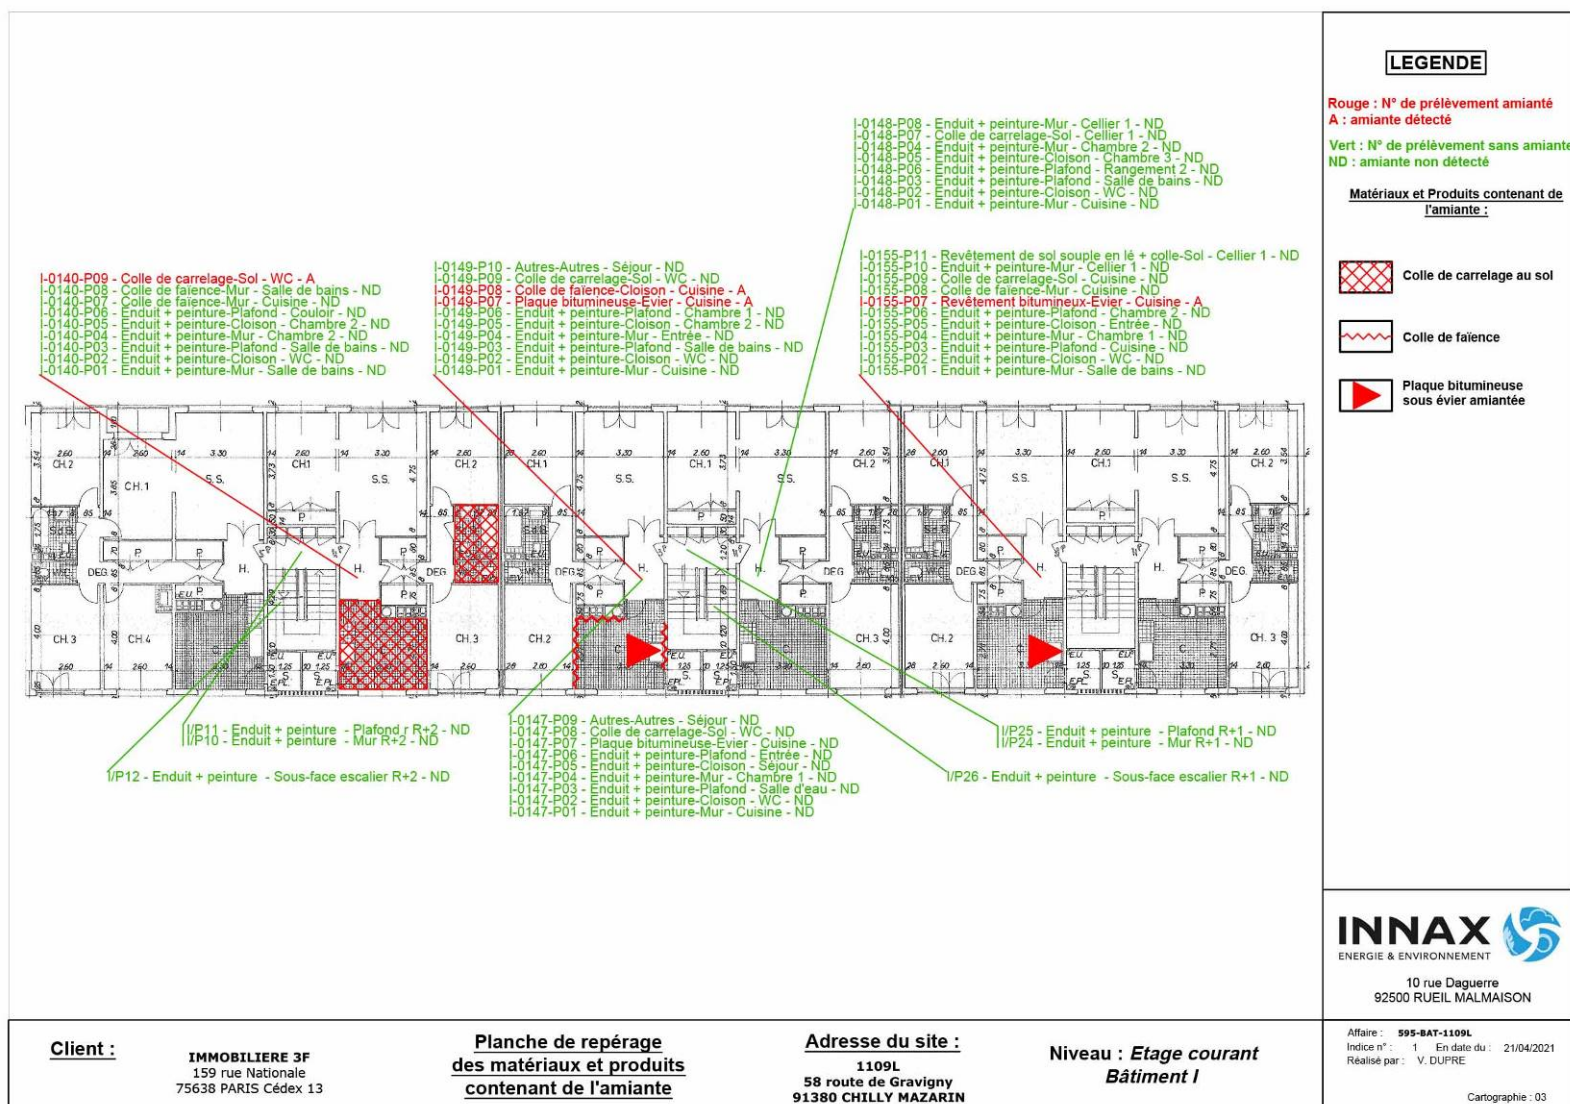


Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

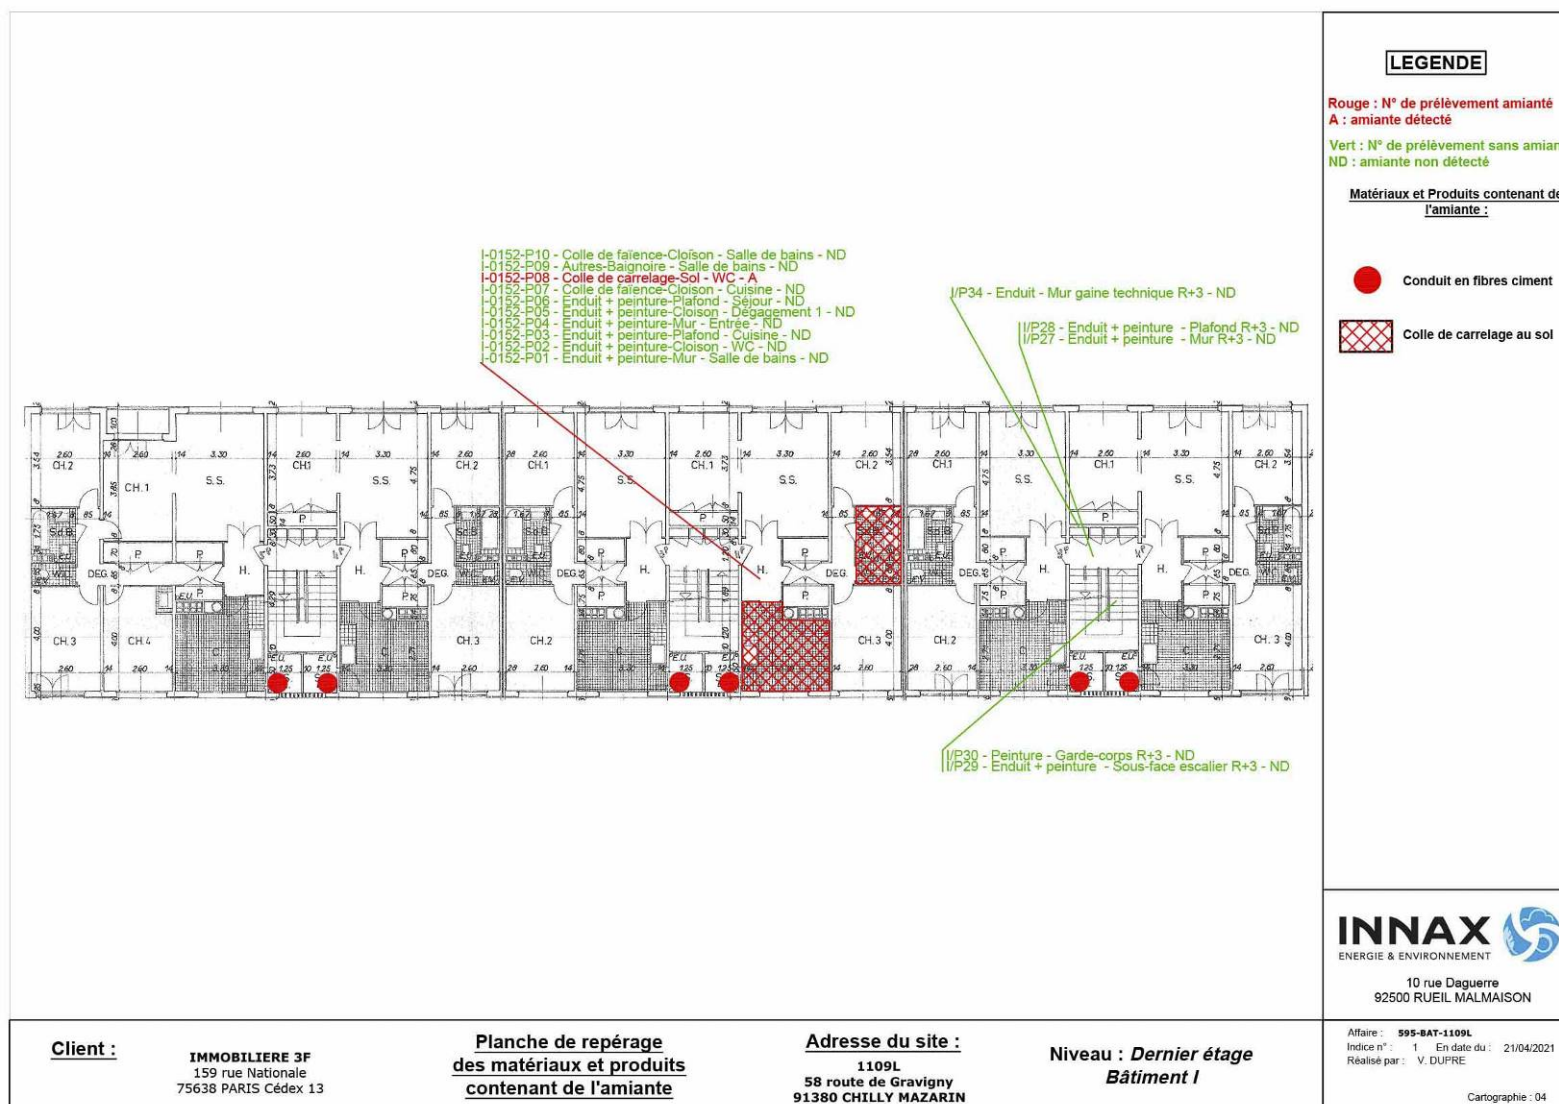

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

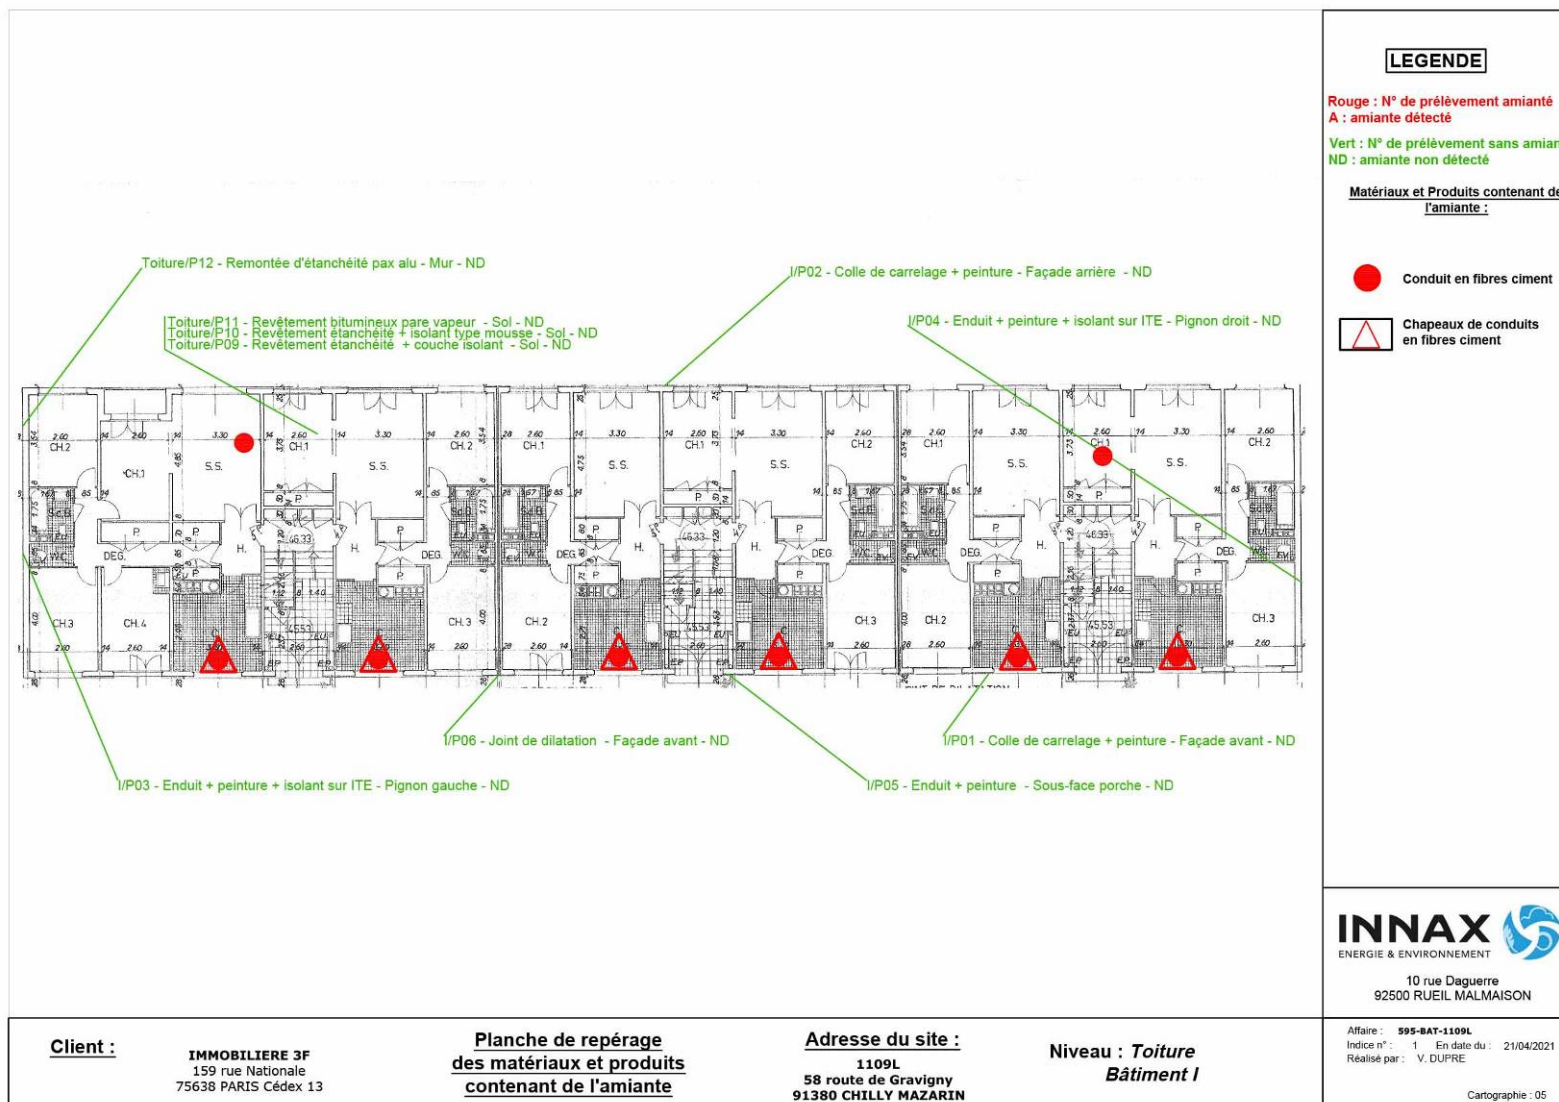

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4. Réalisation du repérage

4.1. Conditions d'interventions

Plans remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :	AUCUN	
	PLANS DETAILLÉS	X
	CROQUIS	
<i>Nota : En l'absence de plans, Innax ne pourra être tenu responsable de la non visite de locaux non visible (locaux orphelins, murés etc...)</i>		
Conditions d'intervention :	Locaux inoccupés	
	Mobilier toujours en place.	X
	Locaux occupés	X
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :	Locataires	

4.2. Liste des pièces visitées

- Parties communes
- Toitures terrasses
- Extérieur
- Logements :

Logt : 0140 13 RUE RODIN	Logt : 0149 15 RUE RODIN
Logt : 0146 15 RUE RODIN	Logt : 0152 15 RUE RODIN
Logt : 0147 15 RUE RODIN	Logt : 0153 17 RUE RODIN
Logt : 0148 15 RUE RODIN	Logt : 0155 17 RUE RODIN

4.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

- Logements :

Logt : 0137 13 RUE RODIN	Logt : 0150 15 RUE RODIN
Logt : 0138 13 RUE RODIN	Logt : 0151 15 RUE RODIN
Logt : 0139 13 RUE RODIN	Logt : 0154 17 RUE RODIN
Logt : 0141 13 RUE RODIN	Logt : 0156 17 RUE RODIN
Logt : 0142 13 RUE RODIN	Logt : 0157 17 RUE RODIN
Logt : 0143 13 RUE RODIN	Logt : 0158 17 RUE RODIN
Logt : 0144 13 RUE RODIN	Logt : 0159 17 RUE RODIN
Logt : 0145 15 RUE RODIN	Logt : 0160 17 RUE RODIN

4.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 :

- Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- Pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- Pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

5. Nature et périmètre des travaux envisagés

- Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :

Bon de commande		3F ^{AL}		Ile-de-France	
REPÉRAGES AMIANTE-PLOMB		Groupe ActionLogement			
Réf. Marché : REPERAGES AMINANTE / PLOMB IDF					
Destinataire :		Nom :		Adresse mail :	
INNAX				innax-amiante-3f@innax.fr	
N° opération :		Date :			
38430 - 1109L		02/02/2021			
N° engagement :		Nature de dépense (code) :			
		231FP			
DEMANDEUR et DESTINATAIRE DU RAPPORT - Responsable de l'opération :					
Direction/Service ou Agence		ARNE			
NOM Prénom		Patrick LEHUEDE			
Tél / Portable		0660303260		Email : patrick.lehuede@groupe3f.fr	
ADRESSE DU SITE : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des adresses concernées)					
N° ESI		1109L			
N° et Voie		58 route de Gravigny			
Code postal		91 380		Ville : CHILLY MAZARIN	
CONTACT 3F POUR PRISE RDV : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des contacts par site)					
En qualité de :		Gardien			
NOM Prénom		M Jean-Yves JEROME			
Tél / Portable		06-64-55-08-38		Email : jean-yves.jerome@groupe3f.fr	
Intervention de préférence tôt le matin ?		☐ (à renseigner avec OUI ou NON)			
Compléments d'informations (ex : étage, n° cages d'escaliers, horaires de prise de RDV, autre personne à contacter, ...) :					
AUTRE(S) DESTINATAIRE(S) DU RAPPORT :					
Email		virginie.fraget@groupe3f.fr			
Email					
Email					
PROGRAMME DE TRAVAUX (le cas échéant) :					
Le Pilote du Prestataire se rapprochera systématiquement du DEMANDEUR pour comprendre en détail le programme de travaux.					
Isolation par l'extérieur des façades, surisolation des pignons. Fermeture des séchoirs (dépose des éléments béton, mise en place d'une nouvelle menuiserie), ravalement des boxes et de la chaufferie. Peinture de sol des balcons. Remplacement des garde-corps des balcons. Etanchéité des toitures terrasses (bâtiments, chaufferie et boxes), création d'un désenfumage dans chaque cage d'escalier (sciage béton et création d'une trémie). Réfection complète des halls traversants, rénovation pour les autres, carrelage, éclairage, peintures, remplacement des BAL. Mise en place d'une résine sur sol du hall au niveau sous-sol. Remplacement des portes de gaines techniques. Halls, paliers et cages d'escalier : peintures, éclairage, habillage des mains courantes, réaménagement des locaux OM (démolition, reconstruction), remplacement des portes de caves (accès et portes individuelles), flocage des planchers hauts d sous sols, dallage (partiel), dépose ou obturation des pelles VO, dépose des réceptacle et obturation des trémies. Dans les logements : Portes piéres, rénovation des pièces humides (sanitaires, faïences, peintures et sols thermoplastiques), mise aux normes de l'électricité, remplacement partiel des chutes dans les logements					

INTITULÉ DE FACTURATION :

Immobilier 3F
ARNE
Patrick LEHUEDE
TSA 11357
75621 PARIS CEDEX 13

Réf. à indiquer sur la facture :


N° engagement :

Signature :

Immobilier 3F^{AL}
Groupe ActionLogement
20, rue Nationale - 75001 Paris Cedex 13
Tél. : 01 42 77 15 15

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

7. Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5590 Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DETOUL Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/08/2018 - Date d'expiration : 20/08/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 27/09/2018 - Date d'expiration : 26/09/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 18/06/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2018 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5576 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MUTANTU Ruddy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 30/06/2020 - Date d'expiration : 29/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 30/06/2020 - Date d'expiration : 29/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 22/10/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 22/04/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 16/07/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/07/2020 - Date d'expiration : 12/03/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 10/09/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 17/07/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'exposition par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 8-0522
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5627

Version 003



Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MIRANDE Antoine

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 07/07/2020 - Date d'expiration : 06/07/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 07/07/2020 - Date d'expiration : 06/07/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 15/01/2019 - Date d'expiration : 14/01/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 31/10/2018 - Date d'expiration : 30/10/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 21/11/2018 - Date d'expiration : 20/11/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 22/10/2018 - Date d'expiration : 21/10/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 22/10/2018 - Date d'expiration : 21/10/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 08/07/2020.

Arrêté du 27 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-8532
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14



**Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de l'Amiante Avant Travaux**

8. Rapports d'analyse

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12707 EN DATE DU 24/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-12707 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-BATIMENT I
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P01 - Colle de carrelage + peinture - bâtiment I - façade avant				Réf échantillon ITGA : IT112102-22063 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise
Peintures multiples non séparable + carrelage + colle grise	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P02 - Colle de carrelage + peinture - bâtiment I - façade arrière				Réf échantillon ITGA : IT112102-22064 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture
Carrelage + colle beige non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P03 - enduit + peinture + isolant sur ITE - bâtiment I - pignon gauche				Réf échantillon ITGA : IT112102-22065 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes) en faible quantité en vrac
Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + polystyrène expansé (billes) en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12707 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22066			
Réf échantillon client : P04 - enduit + peinture + isolant sur ITE - bâtiment I - pignon droit	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22067			
Réf échantillon client : P05 - enduit + peinture - bâtiment I - sous-face porche	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22068			
Réf échantillon client : P06 - Joint de dilatation - bâtiment I - façade avant	Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac			
Matériau bitumineux noir en vrac	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22069			
Réf échantillon client : P07 - enduit + peinture - bâtiment I - entrée 13 - mur RDC	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22070			
Réf échantillon client : P08 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 13 - plafond RDC	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22071			
Réf échantillon client : P09 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 13 - sous-face escalier RDC	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22072			
Réf échantillon client : P10 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 13 - mur R+2	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22073			
Réf échantillon client : P11 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 13 - plafond r R+2	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22074			
Réf échantillon client : P12 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 13 - sous-face escalier R+2	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc / Matériau beige			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau beige non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12707 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22075			
Réf échantillon client : P13 - Peinture - bâtiment I - entrée 13 - garde-corps RDC	Description ITGA : Peintures multiples en vrac			
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22076			
Réf échantillon client : P14 - enduit - bâtiment I - entrée 13 - mur cave	Description ITGA : Enduit gris en vrac			
Enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22077			
Réf échantillon client : P15 - fibralith - bâtiment I - entrée 13 - plafond cave	Description ITGA : Bois en lamelles avec liant en vrac			
Bois en lamelles avec liant en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22078			
Réf échantillon client : P16 - calorifuge - bâtiment I - entrée 13 - plafond R-1	Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau fibreux jaune avec poussières			
Toile blanche enduite non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22079			
Réf échantillon client : P17 - enduit - bâtiment I - entrée 13 - mur gaine technique R-1	Description ITGA : Enduit gris en vrac / Bois massif en vrac			
Enduit gris en vrac + bois massif en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22080			
Réf échantillon client : P18 - enduit + peinture - bâtiment I - entrée 13 - mur local OM	Description ITGA : Enduit gris en vrac			
Enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22081			
Réf échantillon client : P19 - fibralith - bâtiment I - entrée 13 - plafond local OM	Description ITGA : Peinture / Bois en lamelles avec liant en vrac			
Peinture non séparable + bois en lamelles avec liant en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22082			
Réf échantillon client : P20 - Peinture - bâtiment I - entrée 13 - sol local OM	Description ITGA : Peinture / Matériau gris			
Peinture non séparable + matériau gris non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22083			
Réf échantillon client : P21 - tampon bitumineux - bâtiment I - entrée 13 - trappe local OM	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple			
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22084			
Réf échantillon client : P22 - Isolant type laine de verre - bâtiment I - entrée 13 - trappe local OM	Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières			
Matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12707 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22085			
Réf échantillon client : P23 - Joint sur conduit - bâtiment I - entrée 13 - conduit vide ordure local OM	Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières			
▀ Matériau souple noir avec poussières	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22086			
Réf échantillon client : P24 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 15 - mur R+1	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Matériau gris			
▀ Peinture non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + matériau gris non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22087			
Réf échantillon client : P25 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 15 - plafond R+1	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▀ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22088			
Réf échantillon client : P26 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 15 - sous-face escalier R+1	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▀ Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22089			
Réf échantillon client : P27 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 15 - Mur R+3	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
▀ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22090			
Réf échantillon client : P28 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 15 - plafond R+3	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc			
▀ Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22091			
Réf échantillon client : P29 - Enduit + peinture - bâtiment I - entrée 15 - sous-face escalier R+3	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▀ Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22092			
Réf échantillon client : P30 - Peinture - bâtiment I - entrée 15 - garde-corps R+3	Description ITGA : Peintures multiples en vrac			
▀ Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22093			
Réf échantillon client : P31 - Enduit - bâtiment I - entrée 15 mur cave	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▀ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12707 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22094			
Réf échantillon client : P32 - fibralith - bâtiment I - entrée 15 plafond cave	Description ITGA : Peinture / Bois en lamelles avec liant			
Peinture non séparable + bois en lamelles avec liant	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22095			
Réf échantillon client : P33 - calorifuge - bâtiment I - entrée 15 - plafond R-1	Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau fibreux jaune avec poussières			
Toile blanche enduite non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT112102-22096			
Réf échantillon client : P34 - enduit - bâtiment I - entrée 15 - mur gaine technique R+3	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit gris en vrac			
Peinture en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Charlotte Goncalves - Chef d'équipe





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-18610 EN DATE DU 16/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-18610 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-I-0140
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0140 Réf échantillon ITGA : IT072103-26018				
Réf échantillon client : P01 - Salle de bains, Murs - Enduit + peinture Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac				
Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0140 Réf échantillon ITGA : IT072103-26019				
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac				
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	16/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0140 Réf échantillon ITGA : IT072103-26020				
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac				
Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	16/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0140 Réf échantillon ITGA : IT072103-26021				
Réf échantillon client : P04 - Chambre 2, Murs - Enduit + peinture Description ITGA : Papier peint en faible quantité / Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux beige en vrac				
Papier peint en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	16/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-18610 EN DATE DU 16/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0140		Réf échantillon ITGA : IT072103-26022		
Réf échantillon client : P05 - Chambre 2, Cloisons - Enduit + peinture		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Papier en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0140		Réf échantillon ITGA : IT072103-26023		
Réf échantillon client : P06 - Couloir, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	16/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0140		Réf échantillon ITGA : IT072103-26024		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence grise 20x20)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac	META (1)	1	16/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0140		Réf échantillon ITGA : IT072103-26025		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence beige 20x25)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige		
Peinture non séparable + colle beige	META (1)	1	16/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-I-0140		Réf échantillon ITGA : IT072103-26026		
Réf échantillon client : P09 - WC, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage grise 5x5)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac		
Peinture en faible quantité non séparable + colle grise en faible quantité en vrac	META (1)	1	16/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Carrelage	---			Non analysé

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6733 EN DATE DU 05/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT1421-6733 Réf. Commande Client : AMI-35219-3FGEA0595-1109L-I-0146
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0146	Réf échantillon ITGA : IT142103-6190			
Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0146	Réf échantillon ITGA : IT142103-6191			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0146	Réf échantillon ITGA : IT142103-6192			
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0146	Réf échantillon ITGA : IT142103-6193			
Réf échantillon client : P04 - Chambre 2, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène			
Peinture non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0146	Réf échantillon ITGA : IT142103-6194			
Réf échantillon client : P05 - Entrée, Cloison C - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6733 EN DATE DU 05/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0146		Réf échantillon ITGA : IT142103-6195		
Réf échantillon client : P06 - Dégagement 1, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0146		Réf échantillon ITGA : IT142103-6196		
Réf échantillon client : P07 - Salle de bains, Baignoire, Sous baignoire - Plaque bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0146		Réf échantillon ITGA : IT142103-6197		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Mur B - Colle de faïence (15x20 rectangulaire gris)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche en faible quantité		
Peinture en faible quantité + colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-I-0146		Réf échantillon ITGA : IT142103-6198		
Réf échantillon client : P09 - Cuisine, Mur A - Colle de faïence (20x20 gris)		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche en faible quantité		
Carrelage	---			Non analysé
Colle blanche en faible quantité	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0146		Réf échantillon ITGA : IT142103-6199		
Réf échantillon client : P10 - WC, Sol - Colle de carrelage		Description ITGA : Carrelage en faible quantité en vrac / Colle grise en vrac hétérogène		
Carrelage en faible quantité en vrac	---			Non analysé
Colle grise en vrac hétérogène	META (1)	2	05/03/2021	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6739 EN DATE DU 05/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT1421-6739 Réf. Commande Client : AMI-35219-3FGEA0595-1109L-I-0147
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0147 Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6692 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac			
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0147 Réf échantillon client : P02 - WC, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6693 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0147 Réf échantillon client : P03 - Salle d'eau, Plafond - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6694 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6739 EN DATE DU 05/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0147		Réf échantillon ITGA : IT142103-6695		
Réf échantillon client : P04 - Chambre 1, Murs - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0147		Réf échantillon ITGA : IT142103-6696		
Réf échantillon client : P05 - Séjour, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité en vrac		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Papier en faible quantité en vrac	---			Quantité insuffisante pour analyse
Réf dossier client : 1109L-I-0147		Réf échantillon ITGA : IT142103-6697		
Réf échantillon client : P06 - Entrée, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0147		Réf échantillon ITGA : IT142103-6698		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Evier, Sous-face évier - Plaque bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0147		Réf échantillon ITGA : IT142103-6699		
Réf échantillon client : P08 - WC, Sol - Colle de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise avec poussières / Peinture en faible quantité		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise avec poussières	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité	---			Quantité insuffisante pour analyse
Réf dossier client : 1109L-I-0147		Réf échantillon ITGA : IT142103-6700		
Réf échantillon client : P09 - Séjour, Autres (peinture sur garde corps), Mur C - Autres (garde corps)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Audrey GUILLOU - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6738 EN DATE DU 05/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT1421-6738 Réf. Commande Client : AMI-35219-3FGEA0595-1109L-I-0148
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0148 Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6723 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0148 Réf échantillon client : P02 - WC, Cloison B - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6724 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0148 Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6725 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6738 EN DATE DU 05/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0148		Réf échantillon ITGA : IT142103-6726		
Réf échantillon client : P04 - Chambre 2, Mur C - Enduit + peinture		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0148		Réf échantillon ITGA : IT142103-6727		
Réf échantillon client : P05 - Chambre 3, Cloison A - Enduit + peinture		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0148		Réf échantillon ITGA : IT142103-6728		
Réf échantillon client : P06 - Rangement 2, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0148		Réf échantillon ITGA : IT142103-6729		
Réf échantillon client : P07 - Cellier 1, Sol - Colle de carrelage		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Colle grise / Matériau marron en faible quantité en vrac		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + colle grise + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0148		Réf échantillon ITGA : IT142103-6730		
Réf échantillon client : P08 - Cellier 1, Mur C - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit gris en vrac		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Audrey GUILLOU - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6732 EN DATE DU 05/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT1421-6732 Réf. Commande Client : AMI-35219-3FGEA0595-1109L-I-0149
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6210			
Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6214			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6218			
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	3	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6220			
Réf échantillon client : P04 - Entrée, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris hétérogène			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6732 EN DATE DU 05/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6223			
Réf échantillon client : P05 - Chambre 2, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6225			
Réf échantillon client : P06 - Chambre 1, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6227			
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Evier, Sous-face évier - Plaque bitumineuse	Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac			
Matériau bitumineux noir en vrac	META (2)	1	05/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6229			
Réf échantillon client : P08 - Cuisine, Cloison C - Colle de faïence (10x10 blanc)	Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige			
Peinture	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	05/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6231			
Réf échantillon client : P09 - WC, Sol - Colle de carrelage	Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène			
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac hétérogène	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0149	Réf échantillon ITGA : IT142103-6233			
Réf échantillon client : P10 - Séjour, Autres (garde corps peinture), Mur C - Autres (Garde corps)	Description ITGA : Peintures multiples en vrac			
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6730 EN DATE DU 05/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT1421-6730 Réf. Commande Client : AMI-35219-3FGEA0595-1109L-I-0152
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0152	Réf échantillon ITGA : IT142103-6254			
Réf échantillon client : P01 - Salle de bains, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0152	Réf échantillon ITGA : IT142103-6255			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0152	Réf échantillon ITGA : IT142103-6256			
Réf échantillon client : P03 - Cuisine, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (1)	3	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0152	Réf échantillon ITGA : IT142103-6257			
Réf échantillon client : P04 - Entrée, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6730 EN DATE DU 05/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0152		Réf échantillon ITGA : IT142103-6258		
Réf échantillon client : P05 - Dégagement 1, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0152		Réf échantillon ITGA : IT142103-6259		
Réf échantillon client : P06 - Séjour, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0152		Réf échantillon ITGA : IT142103-6260		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Cloison A - Colle de faïence (20x20 gris)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Matériau souple blanc		
Peinture en faible quantité + colle beige + matériau souple blanc	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-I-0152		Réf échantillon ITGA : IT142103-6261		
Réf échantillon client : P08 - WC, Sol - Colle de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise hétérogène	META (1)	1	05/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 1109L-I-0152		Réf échantillon ITGA : IT142103-6262		
Réf échantillon client : P09 - Salle de bains, Baignoire, Autres (tablier) - Autres (colle faïence 20x25 rectangulaire rose)		Description ITGA : Colle blanche en vrac avec poussières		
Colle blanche en vrac avec poussières	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0152		Réf échantillon ITGA : IT142103-6263		
Réf échantillon client : P10 - Salle de bains, Cloison B - Colle de faïence (20x25 rectangulaire bleu)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche en faible quantité		
Peinture + colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6737 EN DATE DU 05/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT1421-6737 Réf. Commande Client : AMI-35219-3FGEA0595-1109L-I-0153
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0153 Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6757 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en faible quantité en vrac			
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0153 Réf échantillon client : P02 - WC, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6759 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0153 Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-6761 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6737 EN DATE DU 05/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0153		Réf échantillon ITGA : IT142103-6762		
Réf échantillon client : P04 - Chambre 1, Murs - Enduit + peinture		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0153		Réf échantillon ITGA : IT142103-6763		
Réf échantillon client : P05 - Dégagement 1, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en faible quantité en vrac	---			Quantité insuffisante pour analyse
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0153		Réf échantillon ITGA : IT142103-6764		
Réf échantillon client : P06 - Chambre 2, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0153		Réf échantillon ITGA : IT142103-6765		
Réf échantillon client : P07 - Salle de bains, Baignoire, Sous baignoire - Plaque bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
▸ Matériau bitumineux noir	META (2)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0153		Réf échantillon ITGA : IT142103-6766		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Mur D - Colle de faïence (15x15 blanc)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Carrelage / Colle blanche		
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + colle blanche	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-I-0153		Réf échantillon ITGA : IT142103-6767		
Réf échantillon client : P09 - Salle de bains, Sol - Colle de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise avec poussières		
Carrelage	---			Non analysé
▸ Colle grise avec poussières	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0153		Réf échantillon ITGA : IT142103-6768		
Réf échantillon client : P10 - Séjour, Autres (garde corps), Mur C - Autres (garde corps peinture)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
▸ Peintures multiples en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Audrey GUILLOU - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6729 EN DATE DU 05/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT1421-6729 Réf. Commande Client : AMI-35219-3FGEA0595-1109L-I-0155
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0155	Réf échantillon ITGA : IT142103-6355			
Réf échantillon client : P01 - Salle de bains, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0155	Réf échantillon ITGA : IT142103-6356			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0155	Réf échantillon ITGA : IT142103-6357			
Réf échantillon client : P03 - Cuisine, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0155	Réf échantillon ITGA : IT142103-6358			
Réf échantillon client : P04 - Chambre 1, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène			
Peinture non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0155	Réf échantillon ITGA : IT142103-6359			
Réf échantillon client : P05 - Entrée, Cloison, Angle de mur - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-6729 EN DATE DU 05/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-I-0155		Réf échantillon ITGA : IT142103-6360		
Réf échantillon client : P06 - Chambre 2, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0155		Réf échantillon ITGA : IT142103-6361		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Evier, Sous-face évier - Revêtement bitumineux		Description ITGA : Revêtement bitumineux noir en vrac		
Revêtement bitumineux noir en vrac	META (2)	1	05/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 1109L-I-0155		Réf échantillon ITGA : IT142103-6362		
Réf échantillon client : P08 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (10x10 blanc)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige		
Peinture + colle beige	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-I-0155		Réf échantillon ITGA : IT142103-6363		
Réf échantillon client : P09 - Cuisine, Sol - Colle de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle beige		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0155		Réf échantillon ITGA : IT142103-6364		
Réf échantillon client : P10 - Cellier 1, Murs - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-I-0155		Réf échantillon ITGA : IT142103-6365		
Réf échantillon client : P11 - Cellier 1, Sol - Revêtement de sol souple en lé + colle		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris hétérogène		
Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	05/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Audrey GUILLOU - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13066 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASSE
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P01 - Revêtement étanchéité - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42277 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P02 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42278 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau mousse beige
Matériau bitumineux noir + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P03 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42279 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P04 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42280 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P05 - Revêtement étanchéité - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42281 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42282			
Réf échantillon client : P06 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42283			
Réf échantillon client : P07 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42284			
Réf échantillon client : P08 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42285			
Réf échantillon client : P09 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42286			
Réf échantillon client : P10 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42287			
Réf échantillon client : P11 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42288			
Réf échantillon client : P12 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42289			
Réf échantillon client : P13 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Couche marron			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42290			
Réf échantillon client : P14 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42291			
Réf échantillon client : P15 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42292			
Réf échantillon client : P16 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42293			
Réf échantillon client : P17 - Revêtement étanchéité - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42294			
Réf échantillon client : P18 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42295			
Réf échantillon client : P19 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42296			
Réf échantillon client : P20 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42297			
Réf échantillon client : P21 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42298			
Réf échantillon client : P22 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42299			
Réf échantillon client : P23 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières			
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (2)	3	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42300			
Réf échantillon client : P24 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42301			
Réf échantillon client : P25 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42302			
Réf échantillon client : P26 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42303			
Réf échantillon client : P27 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42304			
Réf échantillon client : P28 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42305			
Réf échantillon client : P29 - Revêtement étanchéité - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42306			
Réf échantillon client : P30 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42307			
Réf échantillon client : P31 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium			
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42308			
Réf échantillon client : P32 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42309			
Réf échantillon client : P33 - Revêtement étanchéité - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42310		
Réf échantillon client : P34 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42311		
Réf échantillon client : P35 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42312		
Réf échantillon client : P36 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42313		
Réf échantillon client : P37 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche grise		
Matériau bitumineux noir + couche grise non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42314		
Réf échantillon client : P38 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42315		
Réf échantillon client : P39 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42316		
Réf échantillon client : P40 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42317		
Réf échantillon client : P41 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons		
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42318		
Réf échantillon client : P42 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium		
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42319		
Réf échantillon client : P43 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42320		
Réf échantillon client : P44 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium		
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42321		
Réf échantillon client : P45 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron		
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42322		
Réf échantillon client : P46 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42323		
Réf échantillon client : P47 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42324		
Réf échantillon client : P48 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42325		
Réf échantillon client : P49 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Couche grise / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige		
Couche grise + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42326		
Réf échantillon client : P50 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons		
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13067 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P51 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42739 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P52 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42740 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron en faible quantité			
Matériau bitumineux noir + couche marron en faible quantité non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P53 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42741 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P54 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42742 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42743	
Réf échantillon client : P55 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Mur			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42744	
Réf échantillon client : P56 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42745	
Réf échantillon client : P57 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42746	
Réf échantillon client : P58 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron	
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42747	
Réf échantillon client : P59 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron	
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42748	
Réf échantillon client : P60 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Carton bitumé beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige	
Carton bitumé beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42749	
Réf échantillon client : P61 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42750	
Réf échantillon client : P62 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Mur			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42751	
Réf échantillon client : P63 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Couche beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige	
Couche beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42752			
Réf échantillon client : P64 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42753			
Réf échantillon client : P65 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile / Couche grise en faible quantité			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile + couche grise en faible quantité non séparable	META (2)	4	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42754			
Réf échantillon client : P66 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42755			
Réf échantillon client : P67 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium / Peinture			
Matériau bitumineux noir avec aluminium + peinture	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42756			
Réf échantillon client : P68 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42757			
Réf échantillon client : P69 - Revêtement étanchéité + couche isolant - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton bitumé			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton bitumé	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42758			
Réf échantillon client : P70 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Couche marron en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse / Matériau mousse beige en faible quantité / Peinture			
Couche marron en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse + matériau mousse beige en faible quantité + peinture	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42759			
Réf échantillon client : P71 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42760		
Réf échantillon client : P72 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42761		
Réf échantillon client : P73 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42762		
Réf échantillon client : P74 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42763		
Réf échantillon client : P75 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42764		
Réf échantillon client : P76 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste

