



NOTE MÉTHODOLOGIQUE

OFFRE DU 21/03/2025

Objet de la consultation	Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment C1 (97 logements) situé au 32, rue Pierre et Marie Curie à Bagnolet (93170)	
Maîtrise d'ouvrage	 EST ENSEMBLE HABITAT	Est Ensemble Habitat 17 rue Molière, 93100 Montreuil Tél : 01.49.20.36.36
Architecte, mandataire	 khora PATRICE MARTIN	KHORA, 37, rue du Sergent Godefroy, 93100 Montreuil Tél : 01 42 87 25 25 / Mail : contact@khora.fr
Bureau d'études, co-traitant	 ipc www.be-ipc.com	IPC, 14 avenue du Général Michel Bizot, 75012 Paris Tél : 01 46 57 19 95 / Mail : ipc@be-ipc.com
Bureau d'études, co-traitant	 pouget Consultants	Pouget Consultants, 81 rue Marcadet, 75018 Paris Tél : 01 42 59 53 64 / Mail : contact@pouget-consultants.fr

SOMMAIRE

1. Rôle de chacun des membres à chaque phase du projet	1
1.1. Équipe proposée en phase études	1
1.2. Équipe proposée en phase travaux - Lots 1 et 2	3
1.3. Suppléants	3
2. Méthodologie envisagée de concertation des locataires	4
2.1. Contexte	4
2.2. Enjeux de la mission	4
2.3. Organisation, information et concertation des usagers	4
3. Planning que l'équipe s'engage à respecter	6
4. Organisation du groupement	7
4.1. Organigramme	7
4.2. La répartition des tâches entre les membres de l'équipe	8
4.3. Une organisation structurée	9
4.4. Le management de la validation	9
4.5. Le déroulement des études	10
4.6. Organisation et suivi des travaux	11
5. Gestion des relations avec le maître d'ouvrage et les autres intervenants (CT, SPS, certificateur...)	12
5.1. Relation avec le Contrôleur Technique (CT)	12
5.2. Relation avec le Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)	12
5.3. Relation avec le Certificateur	12
6. ANNEXES	13
6.1. Présentation des modalités de mise en œuvre prévues pour la réalisation des heures d'insertion professionnelles selon le cadre de mémoire joint en annexe.	13
6.2. Labels	13
6.3. Proposition Honoraires	14

Note méthodologique de management projet

La Maîtrise d'œuvre propose une note méthodologique présentant le rôle de chacun des membres à chaque phase du projet, détaillant la méthodologie envisagée de concertation des locataires, le planning qu'elle s'engage à respecter ainsi que l'organisation du groupement, la gestion des relations avec le maître d'ouvrage et les autres intervenants (CT, SPS, certificateur...)

1. Rôle de chacun des membres à chaque phase du projet

1.1. Équipe proposée en phase études

Photo	Nom	Rôle et diplôme	Responsabilité	Exp.
La direction de projet : Il est l'interlocuteur de référence du Maître d'Ouvrage. Il assure les interfaces, le pilotage des réunions et la restitution des livrables. En interne, il pilote les plannings, valide les livrables et assure les contrôle-qualité, voire participe à la rédaction des éléments de conception. Il s'appuie sur une équipe d'ingénierie Tous Corps d'Etat de son cotraitant.				
	Patrice MARTIN KHORA	Architecte DPLG <i>Interlocuteur référent de la MOA chez KHORA</i>	Interlocuteur de référence du Maître d'Ouvrage en phase conception et suivi de travaux. Il assure les interfaces, le pilotage des réunions et la restitution des livrables. En interne, il pilote le planning, valide les livrables et assure le contrôle-qualité, voir participe à la rédaction des éléments de conception. - Management d'équipes	38 ans
	Dominique HENRIET KHORA	Architecte DPLG et chef de projets KHORA <i>Architecte Diplômé de l'école nationale supérieure d'architecture de NANCY</i>	Interlocuteur principal du Maître d'Ouvrage chez KHORA en phase conception et suivi de travaux. - Gestion de projets de la conception à la réalisation - Référents et supports sur la conception des lots architectes. - Visites de site en DIA - Participe aux réunions - Coordonne la réalisation de la mission - Revue de l'analyse de la faisabilité technique des lots architecte - Assure des résultats communiqués de qualité	30 ans
	Fatima MEGHIT IPC	Architecte DPLG DSA Patrimoine	Interlocutrice principale en phase conception et suivi de travaux garante : - de la relation avec le mandataire et les co-traitants. - de la gestion de projets de la conception à la réalisation - Management d'équipes	25 ans
	Yannick ROJAS IPC	Ingénieur (Mastère Efficacité énergétique dans la rénovation des bâtiments, Licence Pro Acoustique et Vibration et DUT Génie Civil)	Responsable technique responsable de la gestion des projets de la conception à la réalisation - Référents Amiante et TCE hors fluides - Visites de site en DIA - Participe aux réunions - Coordonne la réalisation des missions - Revue de l'analyse de la faisabilité technique	

	Hugo SOREL Pouget consultant	UTBM, ingénieur "Energie"	- Visites de site en DIA - Participe aux réunions - Décrit les CCTP fluides - Analyse les offres (lots fluides)	10 ans
Conception L'équipe conception de KHORA assistera le chef de projet de la conception à la réalisation, produira les plans à toutes phases, l'estimation des quantitatifs liés aux lots architecturaux et sera aussi un support lors de la phase chantier. à chacun de leurs lots. Notre équipe sera force de proposition, sous la responsabilité du chef de projet, pour la proposition de produits, matériaux et équipements.				
	Laurine PICHET KHORA	Architecte HMONP <i>Architecte Diplômée d'État de l'école nationale supérieure d'architecture de PARIS LA VILLETTE et obtention du titre HMONP</i>	- Gestion de projets de la conception à la réalisation - Support en visites de site et des logements en DIAG - Assiste l'architecte chef de projets dans la réalisation des missions - Réalise les plans projet à toutes phases - Assistance à l'analyse des prix et éléments méthodo remis par les entreprises en phase ACT - Support en phase chantier	7 ans
	Rachel RASCO ROMERO KHORA	Architecte DE <i>Architecte Diplômée d'État de l'école nationale supérieure d'architecture de PARIS LA VILLETTE</i>	- Assistante de projets de la conception à la réalisation - Assiste l'architecte dans la réalisation des missions - Réalise les plans projet à toutes phases	2 ans
	Denis JEAN-MARIE DESIREE IPC	Économiste de la construction - Ingénieur CESI spécialisé BTP	- Gestion de projets de la conception à la réalisation - Support en visites de site et des logements en DIAG - Assure l'économie du projet - Rédige les pièces écrites - Support en phase chantier	4 ans
	Annick Duclos Assistante IPC			
	Jonathan LEROYER Pouget Consultants	Ingénieur thermicien UTBM, ingénieur "Energie"	- Réalise les études thermique	8 ans
	Mathias FRADOT Pouget Consultants	Projeteur / Modeleur Technicien supérieur d'études en génie climatique Titre Niveau 5	- Dimensionne et modélise les réseaux fluides (CVC)	10 ans

1.2. Équipe proposée en phase travaux - Lots 1 et 2

Photo	Nom	Rôle et diplôme	Responsabilité	Exp.
Organisation proposée pour les phases travaux : Il pilote les phases travaux et permettent un suivi complet des chantiers. Transmet à la MOA des comptes rendus après chaque visite pour permettre un reporting de l'évolution des opérations.				
	Dominique HENRIET KHORA	Architecte DPLG <i>Architecte Diplômé de l'école nationale supérieure d'architecture de NANCY</i>	- Présent ponctuellement et garant de la bonne réalisation des travaux sur les lots architecturaux - Participe aux réunions de chantier - Réalisation des OPR des lots architecturaux à l'avancée du chantier - Présence pendant la GPA1	30 ans
	Denis JEAN-MARIE DESIREE IPC	Économiste de la construction - Ingénieur CESI spécialisé BTP	- Gestion de projets de la conception à la réalisation - Support en visites de site et des logements en DIAG - Assure l'économie du projet - Rédige les pièces écrites - Support en phase chantier	4 ans
	Hugo SOREL Pouget Consultants	Responsable d'affaires UTBM, ingénieur "Energie"	- Présent ponctuellement et garant de la bonne réalisation des travaux sur les lots fluides	10 ans

1.3. Suppléants

En cas d'absence prolongée ou définitive du chef de projet, le directeur de projet soumettra le profil d'un nouveau responsable à la MOA et sera le suppléant pour toute la durée le nécessitant.

Photo	Nom	Rôle et diplôme	Responsabilité	Exp.
Chef de projet suppléant :				
	Patrice MARTIN KHORA	Architecte DPLG Suppléant KHORA <i>Interlocuteur principal de la MOA chez KHORA</i>	Interlocuteur de référence du Maître d'Ouvrage en phase conception et suivi de travaux. Il assure les interfaces, le pilotage des réunions et la restitution des livrables. En interne, il pilote le planning, valide les livrables et assure le contrôle-qualité, voir participe à la rédaction des éléments de conception.	38 ans
	Hervé CAFFIN Pouget Consultants	<i>Responsable d'affaire Licence "Energie renouvelable"</i>	- Participe aux réunions - Décrit les CCTP fluides - Analyse les offres (lots fluides) - Présent ponctuellement et garant de la bonne réalisation des travaux sur les lots fluides - Participe aux réunions de chantier - Réalisation des OPR des lots fluides à l'avancée du chantier	30 ans

2. Méthodologie envisagée de concertation des locataires

2.1. Contexte

La réhabilitation de la résidence doit impérativement se faire en collaboration avec les locataires pour développer un projet commun. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie, d'imaginer de nouveaux usages, et de s'ancrer dans l'écosystème du NPNRU pour créer du sens et du lien. Notre accompagnement s'inscrit dans nos ambitions qui prévoient :

- un accompagnement social renforcé des locataires et des évolutions d'usages, tant au sein de la résidence que dans les logements.
- Une collaboration active avec le pilote de l'opération urbaine.

L'enquête sociale qui porte sur les 16 600 habitants résidant dans le périmètre du quartier prioritaire de la politique de la ville démontre qu'un grand nombre de personnes sont dans une situation socio-économique fragile :

- le revenu médian par unité de consommation y est de 11 700 € par an
- 22 % des ménages ont des bas revenus et 20 % des ménages reçoivent au moins une allocation chômage,
- 70 % de la population est sans diplôme ou est titulaire d'un diplôme inférieur au baccalauréat,
- seuls 56 % des personnes de 15 à 64 ans occupent un emploi

On peut légitimement estimer que les fragilités sociales, en plus des fragilités économiques des locataires, font de l'accompagnement de ces derniers pendant ces travaux de réhabilitation un enjeu central.

Le programme de réhabilitation comporte deux enjeux majeurs, intrinsèquement liés aux caractéristiques spécifiques du projet :

- D'une part la nature des travaux ;
- D'autre part le déroulement du phasage inhérent au planning du projet de restructuration de l'îlot.

La concertation des habitants dans le cadre de la réhabilitation vise à impliquer les locataires dans un projet commun, en leur offrant un cadre sécurisant et en veillant particulièrement aux plus vulnérables. Ce projet doit également favoriser les échanges entre les habitants pour renforcer la vie de voisinage, imaginer de nouveaux usages, et créer des espaces partagés et des communs.

Dans le programme MOA : Un échantillon représentatif minimum de 20% des logements sera visité.

2.2. Enjeux de la mission

- Acquérir une connaissance fine de l'ensemble des habitants et de la vie au sein de la résidence pour adapter au mieux les temps et espaces d'information et de concertation ;
- Appréhender l'enquête sociale comme une étape indispensable du projet, prendre en compte les fragilités et les attentes individuelles des locataires ;
- Sensibiliser les habitants au projet et les faire participer en vue d'enrichir les scénarios et de préparer le vote des locataires ;
- Identifier un « **lieu repère** » comme support de la concertation avec les locataires et espace de convivialité et de sociabilité, notamment pour les plus isolés ;
- Profiter de la réhabilitation du site et de l'îlot pour donner une nouvelle image et impulser des temps d'animations et de convivialité avec les locataires et acteurs locaux ;

2.3. Organisation, information et concertation des usagers

2.3.1. Phase DIAG – Etudes Diagnostics

I. Réunion d'information pour lancer la mission :

Avec l'appui du gardien et des équipes de proximité de Est Ensemble Habitat, en présence des locataires, commerçants et du personnel des locaux associatifs présents sur le site, elle permet de :

- Présenter l'équipe dédiée au projet et les compétences de chacun ;
- Présenter l'opération de réhabilitation :
 - ▶ Partager les objectifs du programme de réhabilitation et présenter les différentes phases du projet ;
 - ▶ Expliquer le fonctionnement d'une opération de réhabilitation en milieu occupé : un livret synthétisant le fonctionnement sera remis aux locataires présents (le livret comprendra un planning prévisionnel des actions) ;
 - ▶ Présenter les moments de mobilisation/participation (il s'agira de valoriser le pouvoir d'agir et l'expertise des habitants).

Au cours de cette réunion il sera proposé aux participant.es qui le souhaitent de devenir des référents pendant toute la durée de la mission. Le référent pourra être :

- Un relais d'information supplémentaire pendant toute la durée du projet ;
- Un facilitateur pour la mobilisation.

Ils seront informés de l'avancée du projet et des travaux. Les habitants souhaitant être référents seront invités à laisser leurs coordonnées afin d'être contactés. Une première réunion sera organisée avec ces derniers afin d'échanger sur leurs rôles.

NB : La première réunion d'information est un moment important, tant pour le groupement que pour les locataires et usagers de la résidence. Elle officialise le lancement du programme de réhabilitation. Pour assurer la cohérence et l'identification des acteurs en charge, notamment de la concertation.

II. L'enquête sociale et l'analyse des usages

Cette étape indispensable pour la réussite du projet vise à :

- Repérer les situations de fragilités et identifier les personnes, notamment âgées, qui nécessitent un accompagnement spécifique ;
- Mettre en avant les envies et besoins des locataires en matière de déménagement / relogement ;
- Recenser l'état technique du logement ;
- Recenser les usages existants et les besoins futurs pour améliorer la qualité d'usage de la résidence (OM, utilisation des espaces extérieurs, relations de voisinage) ;

Plusieurs modes opératoires seront conjointement mis en oeuvre pour favoriser une prise de rendez-vous efficace et exhaustive :

- Un courrier par voie postale pourra être envoyé aux locataires.
- En coordination avec Khora, le gardien du site aura à disposition dans la loge des cahiers d'inscription avec des créneaux horaires prédéfinis sur lesquels pourront s'inscrire les locataires ;
- Le porte à porte et la présence sur site permettront de prendre des rendez-vous avec les habitants rencontrés ;

III. La restitution du diagnostic :

Deux temps de restitution sont prévus :

- Un temps destiné à Est ensemble Habitat, avec une présentation précise et détaillée du diagnostic social et technique.
- Ensuite, un moment de restitution sera organisé pour les locataires et occupants du site. Cet événement convivial permettra aux participants de voir concrètement les résultats de leurs contributions. Il devra être ludique, accessible à tous, et accompagné de documents de présentation adapté

Ces documents de présentation seront envoyés en amont aux personnes ayant participé à l'enquête, après validation de Est ensemble Habitat

- Des éléments de communication seront produits en amont afin d'informer les locataires de l'événement (affichage, boitage de flyer, porte à porte) et affichés dans les halls.

2.3.2.Phase AVP

Des ateliers participatifs de concertation seront organisés en parallèle des entretiens à domicile. L'objectif des ateliers est de faire participer les locataires au diagnostic, de faire ressortir leurs envies, leurs souhaits concernant les sujets d'ordre collectif, leur faire émettre des préconisations qui devront être prises en compte dans les scénarios qui leur seront proposés.

- 1 atelier de concertation « diagnostic partagé » avec les locataires concernant les espaces communs extérieurs : cours intérieures, locaux vélos, locaux poubelles ; loisirs, détente, décoration

2.3.3.Phase DET

La phase de travaux tel que décrit débutera par une réunion d'informations à tous les locataires afin de leur présenter les équipes travaux, les plannings prévisionnels et le programme de travaux définitifs afin que les résidents puissent se projeter à l'issue de l'opération. Elle sera également l'occasion de répondre aux questions que les résidents et les commerces se poseront.

Outre la réunion de chantier hebdomadaires, nous avons prévu des visites inopinées tout le long de l'opération ainsi qu'un nombre de visites accrues lors de démarrages des travaux dans les 5 bâtiments.

La communication sera une des clés du succès de cette opération. Nous prévoyons les moyens de communication qui seront mise au point avec EEH pour cette opération de réhabilitation en milieu occupé..

Nous prévoyons également des temps d'échanges spécifiques avec les résidents, pour nous assurer qu'ils vivent ce chantier le plus harmonieusement possible. Ces échanges seront facilités par la mise en place de « café réhabilitation » en amont de la réunion de chantier, correspondant à un temps d'échange d'une heure en présence des entreprises de travaux afin d'aborder des difficultés rencontrées par les résidents (OPR non levées, nuisances sonores, emprise chantier, etc.). Ces temps d'échanges spécifiques, que nous prévoyons mensuels, permettent de désamorcer bon nombre de situations mal vécues par les résidents.

POINTS DE VIGILANCE EN PHASE TRAVAUX ET ACTION PRÉVUES

Nous prévoyons les actions suivantes :

1. Réunions de concertation :

- Nous étudierons la possibilité d'aménager un local actuellement inoccupé pour offrir aux locataires présents en journée un espace de repli en cas de gêne occasionnée par le bruit ou la poussière.
- Nous organiserons des réunions régulières avec les résidents pour les informer de l'avancement des travaux et répondre à leurs questions.
- Nous constituerons un comité de suivi composé de représentants des résidents et des équipes techniques.
- Un référent locataire sera désigné par l'entreprise de travaux, et ses coordonnées seront communiquées pour permettre une réaction rapide en cas d'incident.


2. Communication continue :

- Nous diffuserons des bulletins d'information périodiques pour tenir les résidents informés.
- Nous mettrons en place un point d'information sur le chantier, accessible à tous

3. Gestion des nuisances :

- Dans la mesure du possible, nous planifierons les travaux bruyants en dehors des heures sensibles pour minimiser les désagréments.
- Nous mettrons en œuvre des solutions temporaires pour assurer le confort des résidents, telles que des accès alternatifs et des protections contre la poussière.
- Nous veillerons particulièrement au nettoyage des parties communes pendant et après les travaux, notamment en fin de semaine.

3. Planning que l'équipe s'engage à respecter

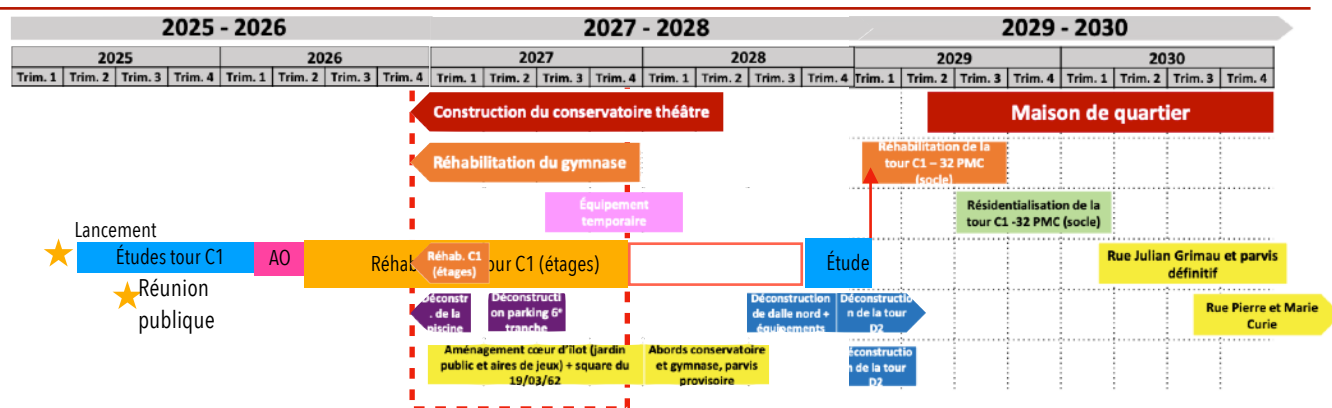

Le planning proposée au dossier de consultation est le suivant :

- 1e trimestre 2025 : Désignation de la MOE et lancement des études
- Juin 2025 : réunion publique
- 4e trimestre 2025 : Présentation du DCE
- 1e trimestre 2026 : Lancement appel d'offres marché de travaux
- Durée estimative des travaux phase 1 : 18 mois y compris période de préparation de chantier
- Durée estimative des travaux phase 2 : 6 mois

Nous avons intégré ces phases dans le planning global de l'opération afin d'estimer le décalage entre les deux phases proposées. Le diagramme soulève plusieurs questions :


- Si une seule entreprise est retenue, il sera nécessaire de réaliser le projet du soubassement (aménagement et façades) pour cet appel d'offres, prévu au premier trimestre 2026. Cela signifie que cette partie du projet devra être conçue avant la démolition de la terrasse nord, programmée au premier trimestre 2029.
- Pour cela, un relevé géométrique précis de l'existant devra être réalisé pour définir le support du projet de ce soubassement
- Cette approche générera deux chantiers distincts, chacun avec des missions VISA/DET/AOR séparées.

Les réponses du maître d'ouvrage influenceront les délais de travail que nous garantirons. Pour notre proposition d'honoraires, nous avons pris en compte les éléments suivants :

- Une étude globale unique
- Un appel d'offre unique en entreprise générale
- Un marché de travaux en deux phases avec une réception pour chaque phase
- Deux phases d'exécution (VISA+DET+AOR) pour chaque phase de travaux

4. Organisation du groupement

4.1. Organigramme

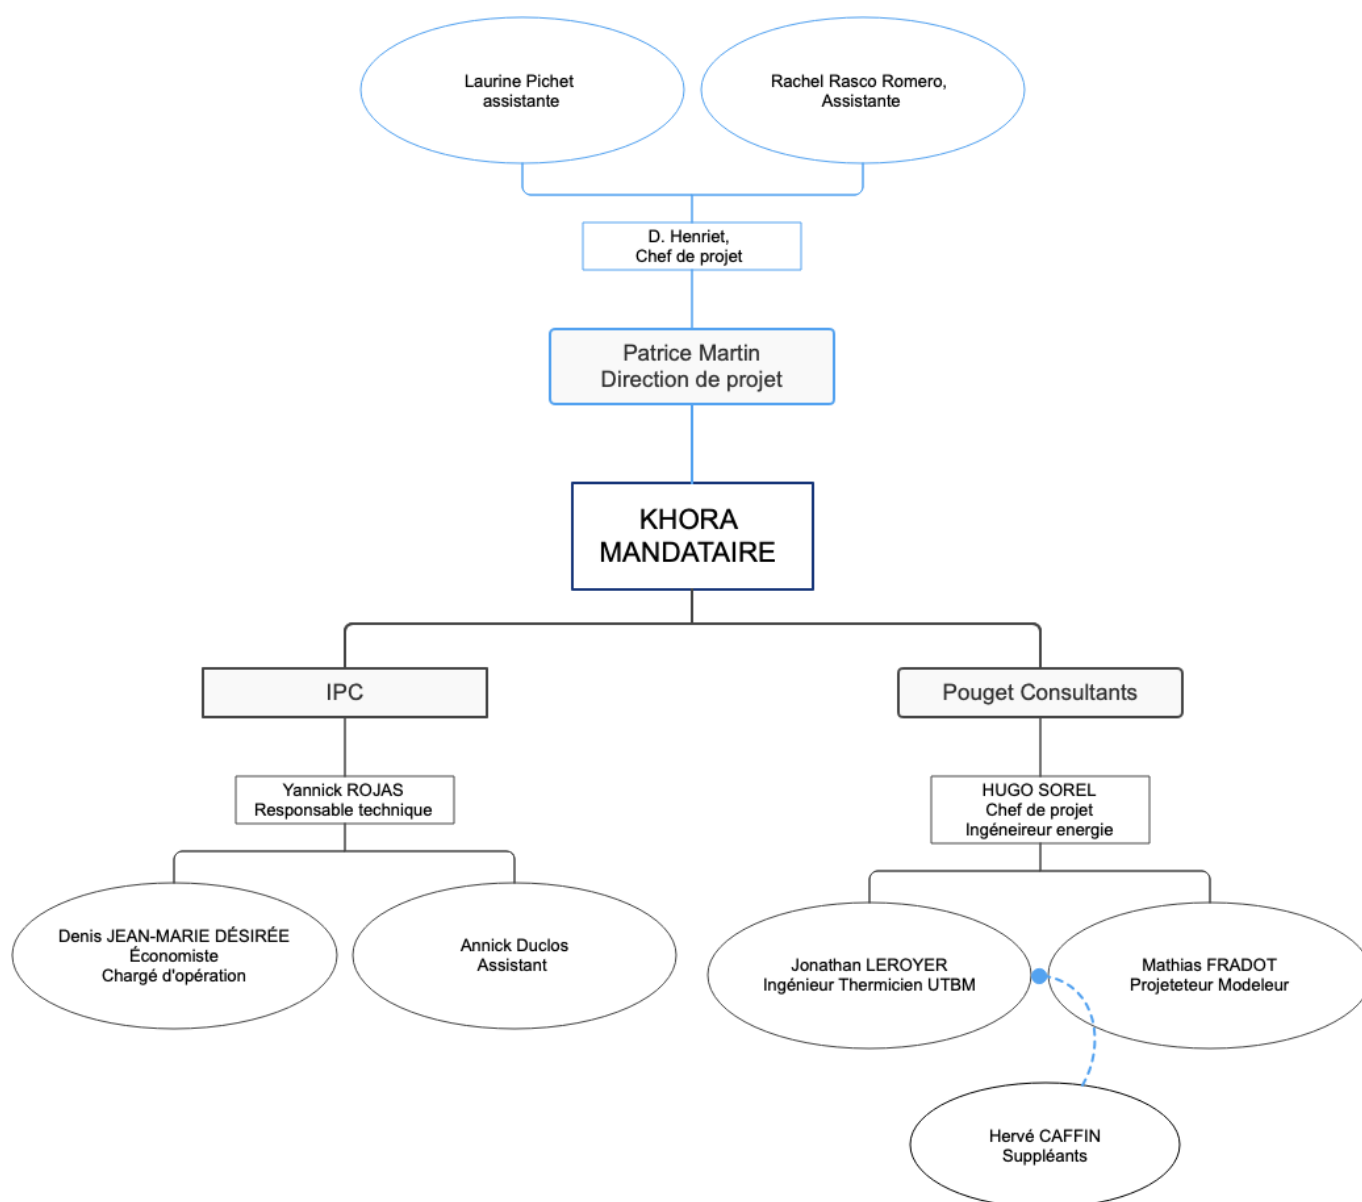

4.2. La répartition des tâches entre les membres de l'équipe

- KHORA, architecte mandataire, agence d'architecture spécialisée dans la réhabilitation énergétique d'ensembles immobiliers du parc social aura à sa charge la conception architecturale, la synthèse, la relation locataire, le suivi du chantier et de la réception
- IPC, bureau d'études généraliste et amiante, économiste de la construction, OPC, est spécialisé dans les réhabilitations du logement social en milieu occupé ou vide aura en charge les compétences de BE généraliste, désamiantage et économie de la construction
- Pouget Consultants, bureau d'études thermique fluides et environnement, spécialité dans les réhabilitations thermiques en milieu occupé aura en charge les compétences de fluides, HQE, thermique, bas carbone, réemploi et réutilisation, traitement des déchets

MISSIONS E = Exécute / P = Participe	KHORA	IPC	Pouget Consulta nts
ESQUISSES - DIAGNOSTIC			
Etablissement d'une notice de présentation générale	E	E	E
Analyse fonctionnelle et technique de l'existant	E	E	E
Définition des besoins : affinement du programme	E	E	P
Validation du budget	E	E	P
APS			
Relevés des ouvrages techniques	E	E	P
Définition des prestations et des lots	E	E	E
Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux	P	E	E
Pré-étude thermique			E
APD			
Plans avant/après du programme travaux	P	P	
Définition des prestations et des lots	E	E	E
Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux	P	E	E
Information technique des locataires	E	E	P
PRO			
Bilan des économies d'énergie			E
Préparation du DCE composé de :			
- Plans	E	E	E
- Descriptif (CCTP) + Cadres de bordereaux DPGF	P	E	E
ACT			
Analyse comparative et détaillée des offres des entreprises	P	E	P
Contrôle qualifications et assurances entreprises retenues	P	E	P
VISA			
Visa des études et des plans des entreprises	E	E	E
DET			

MISSIONS E = Exécute / P = Participe	KHORA	IPC	Pouget Consulta nts
Information des locataires par réunion	E	P	P
Etablissement fiches travaux et relations locataires	E		
Direction des travaux, rédaction et diffusion des comptes rendus	E		
Vérification des situations de travaux	E		
AOR			
Réceptions et levées de réserves	E	P	P
D.G.D.	E	P	
Dossier des ouvrages exécutés	E	E	E

4.3. Une organisation structurée

Une organisation et des règles de fonctionnement pratiques seront établies, afin d'éviter les reprises et modifications multiples et surtout afin de réduire les délais d'études, favorisant ainsi la tenue du délai global de réalisation.

a. Les réunions d'avant-projet :

Un contrôle régulier et un suivi systématique de l'avancement des études se traduiront par des réunions formelles. Elles feront l'objet d'un compte rendu dans les 48 heures.

b. Les réunions de contrôle et d'avancement des études :

Elles visent à informer le maître d'ouvrage de l'avancement des études et à décider des actions à entreprendre pour atteindre les objectifs fixés.

c. Les revues techniques :

Dès qu'un aspect technique nécessite une analyse, les différents interlocuteurs concernés (services techniques, techniciens de maintenance, etc.) seront réunis à la demande du mandataire de l'équipe maîtrise d'œuvre.

Ces revues permettront également d'examiner les concepts techniques décrits par les ingénieurs. Les systèmes, équipements, installations, services et fournitures, ainsi que leurs mises en œuvre, seront présentés et expliqués. Chaque acteur évaluera la fiabilité, la qualité, la sécurité et la pérennité des concepts, produits ou installations proposés.

d. Le Management qualité :

Une démarche qualité sera appliquée à l'ensemble de l'équipe. Les méthodes, outils et procédures développés permettront aux intervenants de collaborer dans un cadre structuré, excluant toute improvisation et favorisant ainsi la maîtrise des coûts, des délais et la qualité technique.

e. Les procédures :

Une attention particulière sera portée au démarrage de notre mission et au lancement du projet. Une réunion de lancement sera organisée par le mandataire de l'équipe, en présence des différents acteurs.

Elle a pour objectifs immédiats :

- Préparation du planning projet ;
- Planification des réunions du management opérationnel ;
- Identification et planification des rendez-vous à prendre avec extérieurs (services d'urbanisme, services d'architecture, services techniques, etc. suivant nécessité)
- Établissement de la nomenclature, de l'ordre et du calendrier des documents à fournir ;
- Énumération et analyse des points durs et tâches critiques (contraintes à résoudre, réponses administratives non maîtrisées)

4.4. Le management de la validation

Ce principe d'aide à la décision aura pour ambition, au-delà de se poser les bonnes questions, de savoir qui peut et doit y apporter la réponse

a. La validation en continu :

C'est un exercice dans lequel les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre élaboreront collectivement les avant projets, afin de tenir le délai nécessaire au respect du planning souhaité.

Le procédé est participatif, verbal et interactif. Chaque interlocuteur comprend son rôle et se situe dans le plan global.

b. Les réunions de mises au point :

Elles seront régulières durant la phase Diagnostic, l'APS, l'APD et le PROJET. L'ordre du jour est fixé et le compte rendu rédigé par le chef de projet de l'équipe. L'objectif est d'éviter le travail à huis clos loin des préoccupations du Maître d'Ouvrage et de s'assurer que l'on traduit bien les enjeux.

4.5. Le déroulement des études

a. Diagnostic et esquisse :

La phase diagnostic consistera non seulement en une prise de connaissance du bâtiment et des contraintes programmatiques, elle s'accompagnera également d'une première faisabilité technique sur laquelle se fonderont les études. Il s'agira notamment d'effectuer un inventaire et un prédimensionnement des ouvrages techniques pouvant impacter le projet.

Le diagnostic est réalisé dans une totale impartialité, en s'appuyant sur le pré programme de la MOA sans toutefois se limiter à ses conclusions. Ce diagnostic se concrétise de la manière suivante :

- des visites d'état des lieux des immeubles et d'un échantillon représentatif des logements;
- des réunions de travail avec les gestionnaires et le gardien afin d'appréhender le fonctionnement général des immeubles ;
- une analyse des documents remis par le maître d'ouvrage (plans, état du gros entretien et des grosses réparations, diagnostics ...);
- la rédaction d'un rapport dans lequel sont jugés l'état de l'immeuble, l'opportunité et l'importance des travaux à réaliser pour assurer leur pérennité et leur bon fonctionnement ;
- des propositions d'amélioration visant la sécurité des personnes et des biens, le confort des usagers, les modernisations et les mises en conformité ;
- une esquisse architecturale présentant, sous forme de schémas ou de croquis, des intentions et un parti;
- un chiffrage de ces propositions, sous la forme de programmes cohérents représentant plusieurs niveaux d'investissement.
- une étude thermique

C'est à ce niveau que le maître d'ouvrage devra diligenter les diagnostics complémentaires qui seront indispensables pour la phase suivante.

b. Etudes d'avant-projet (APS et APD) :

Elles s'établissent, à la suite des arbitrages rendus par la maîtrise d'ouvrage, sur la base des propositions esquissées qui ont été validées. Elles se nourrissent également des résultats des diagnostics complémentaires.

Il est nécessaire à ce stade d'intégrer les demandes spécifiques des habitants que le maître d'ouvrage aura pris soin de consulter quant à leurs souhaits en matière de réhabilitation de leurs logements.

L'étude thermique sera mise à jour par POUGET Consultants.

Les études se concluront par la remise du dossier de demandes d'autorisation d'urbanisme.

c. Etudes de projet (PRO) :

Cette étape doit intégrer les observations du CSPA et du CT, puis apporter toutes les précisions concernant l'aspect ou la qualité des matériaux et les performances des matériels que le maître d'ouvrage souhaite voir mis en œuvre.

Le PRO est également l'occasion d'étudier finement certains tous les points singuliers qui participent à la qualité du projet ou garantissent la pérennité des ouvrages ; Il s'agit en l'occurrence de produire des détails constructifs à une échelle adaptée.

d. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

- Dossier de consultation des entreprises :

Les pièces techniques établies lors du PRO sont éventuellement amendées selon les observations formulées par le CT

Les pièces administratives sont établies à partir des pièces fournies par le maître d'ouvrage.

- Analyse des offres :

Elle s'effectue après la saisie dans un fichier tableur des bordereaux estimatifs des entreprises afin de faire apparaître les anomalies et erreurs pour chaque ouvrage.

Les offres sont ensuite analysées en tenant compte des critères de sélection que le maître d'ouvrage a définis dans son Règlement de la Consultation.

4.6. Organisation et suivi des travaux

a. Période préparatoire :

Lors de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, il est prévu :

- La participation à l'information des locataires en liaison avec d'autres intervenants de la maîtrise d'œuvre,
- La mise au point de toutes les interventions objet du marché de l'entreprise (obtention de tous les dossiers techniques, demandes de mise au point, visa de ces dossiers, etc...), la réception des ouvrages témoins,
- La visite préalable aux travaux et la fiche personnalisée des travaux,
- La validation du planning général des différents corps d'état et du planning logement (par logement et par jour)
- La validation des demandes d'agréments de sous-traitants Les locataires seront informés des dates d'intervention dans le bâtiment et dans leur logement par affichage et par courrier afin qu'ils puissent prendre toutes leurs dispositions.
- L'équipe travaux mettra au point l'ordre et la durée nécessaires à la réalisation des travaux dans les logements et parties communes. Il sera nécessaire d'imaginer un phasage des travaux conçu de manière à limiter la gêne pour la vie quotidienne des locataires.

b. Intervention dans les logements :

Les locataires seront informés des dates d'intervention dans le bâtiment et dans leur logement par affichage et par courrier personnalisé afin qu'ils puissent prendre toutes leurs dispositions.

Il convient d'imposer aux entreprises intervenant dans les logements une organisation rigoureuse pour faciliter le travail de chacun et minimiser la gêne occasionnée aux locataires.

Avant tous travaux dans le logement, l'entreprise devra mettre en place des protections qu'elle retirera chaque jour en fin de travaux. Le personnel de chantier évacuera les gravois au cours des travaux dans le logement et nettoiera les salissures tous les soirs.

Les ouvriers auront interdiction d'utiliser les sanitaires des logements, même vacants, et de brancher leurs appareils sur les installations électriques.

c. Surveillance des travaux :

Pendant toute la durée du chantier, les locataires auront pour interlocuteur le responsable de l'équipe travaux présent en permanence pendant les heures ouvrables.

Le responsable de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi technique du chantier sera à l'écoute des locataires. Il prendra connaissance des problèmes signalés en rapport avec l'exécution des travaux et, après analyse, proposera une solution adaptée. Lors de visites ponctuelles et inopinées, il veillera à la bonne exécution des travaux mis en œuvre sur le chantier et au respect de la méthodologie d'intervention définie pendant la préparation du chantier et il assurera la gestion du calendrier de l'opération et du respect des délais. Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement des travaux et sur la diffusion des avis de passage avant intervention.

Un dispositif sera mis en place pour le traitement des demandes de renseignements ou réclamations formulées par les locataires. Il comprend :

- un cahier "spécifique réhabilitation" laissé à disposition pendant toute la durée du chantier ;
- l'instauration d'une permanence de l'entreprise sur le chantier au moins deux jours par semaine à un horaire adapté ;
- la mise en place d'une boîte à lettres accessible en dehors des heures d'ouverture de la permanence et d'une ligne « locataire » avec répondeur téléphonique ou d'une adresse « mail » dédiée
- d'autres moyens pourront être mis en place à la demande du maître d'ouvrage : adresse mail, utilisation d'application spécifique...

d. Visite de fin de travaux – OPR :

Une fois les travaux terminés, dans chaque logement l'équipe de maîtrise d'œuvre procédera avec le ou les responsables des entreprises à une visite de réception des travaux (de préférence avec le maître d'ouvrage) et en présence si possible du locataire pour constater leur bonne exécution.

Ces réceptions seront réalisées à l'aide d'une de nos tablettes numériques équipées du logiciel Final CAD. Ce logiciel permettra d'établir une fiche d'OPR par logement, façade, partie commune ou couverture. Cette fiche présente les réserves constatées, leur état (à faire, levée). Ce logiciel permet l'extraction des données au format EXCEL et par conséquent de suivre le traitement des réserves par lot, entreprise, logement...

Les levées des éventuelles réserves seront organisées de manière à être effectuées le plus rapidement possible après la réception des ouvrages, de manière à limiter la gêne qu'occasionnerait les ultimes travaux de reprise ou de finition

e. Suivi pendant la GPA

Dans le cadre de sa mission de coordination des travaux et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre examinera les désordres qui apparaîtraient postérieurement à la réception et fera en sorte que les entrepreneurs y remédient avec célérité, et plus particulièrement lorsque la sécurité et le confort des locataires seraient en jeu.

Le suivi des réclamations pendant la phase GPA est assuré par la mise en place d'un fichier sur une plateforme internet de type GED où tous les intervenants peuvent avoir accès :

- Le maître d'ouvrage pour mentionner la réclamation et suivre les réponses des entreprises
- Le maître d'œuvre pour contrôler le suivi des réclamations et analyser les réponses des entreprises
- Les entreprises pour mentionner les actions mis en place ou le refus pour traiter cette réclamation

5. Gestion des relations avec le maître d'ouvrage et les autres intervenants (CT, SPS, certificateur...)

La gestion des relations entre l'équipe de maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage, et les autres intervenants (CT, SPS, certificateur, etc.) est cruciale pour le succès d'un projet de construction. Une communication efficace, une collaboration étroite, et une compréhension claire des rôles et responsabilités de chacun sont essentielles pour assurer la qualité, le respect des délais, et la conformité réglementaire du projet.

Nous mettons en place les actions suivantes :

5.1. Relation avec le Contrôleur Technique (CT)

- **Fournir au CT** tous les documents nécessaires (plans, calculs, rapports) en temps voulu.
- **Organiser des réunions en visio avec le CT** pour discuter des points de contrôle et des éventuelles non-conformités.
- **Mettre en œuvre les recommandations du CT** et informer le maître d'ouvrage des actions entreprises.
- **Mise en conformité du dossier PRO** avec le RICT avant lancement de l'AO
- **Mise en œuvre d'une procédure** de suivi de réponses de l'entreprise aux avis du CT pour arriver en fin de travaux à un RFCT sans réserve

5.2. Relation avec le Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

- **Élaborer et mettre à jour** le plan de prévention en collaboration avec le CSPS.
- **Organiser des sessions de formation** et de sensibilisation aux risques pour les équipes de chantier.
- **Signaler immédiatement tout incident** ou accident au SPS et mettre en place des mesures correctives.

5.3. Relation avec le Certificateur

- **Constituer les dossiers de certification** en respectant les délais et les exigences du certificateur.
- **Faciliter les visites de contrôle du certificateur** et fournir toutes les informations nécessaires.
- **Traiter rapidement les non-conformités** signalées par le certificateur et informer le maître d'ouvrage des actions entreprises.

6. ANNEXES

6.1.Présentation des modalités de mise en œuvre prévues pour la réalisation des heures d'insertion professionnelles selon le cadre de mémoire joint en annexe.

Notre offre inclut un volume d'heures de 245h dédiées à l'insertion, conformément au § 5.2.:1 du CCAP. La répartition de ces heures entre les cotraitants du groupement de maîtrise d'œuvre se fera au prorata de la part d'honoraires de chacun.

Nous nous engageons à respecter ce volume horaire. En cas de difficulté d'un de nos co-traitants à valoriser ses heures d'insertion, notre groupement sera solidaire : si l'intégration d'un des profils retenus par un autre co-traitant s'avérait concluante, le co-traitant en question compenserait les heures du co-traitant « défaillant » à qui il facturerait à prix coûtant les heures manquantes.

Nous avons pris connaissance des types de profils de demandeurs d'emploi entrant dans le cadre de la clause d'insertion décrit au § 5.2.2 du CCAP et des partenaires qui nous accompagneront sur le sujet. Ainsi, le public ciblé par nos actions concernera en priorité les habitants de Seine St Denis (si possible des habitants du quartier des Malassis en capacité de répondre à nos besoins). Nos actions afin de répondre à cet enjeu de réinsertion par l'activité économique seront ordonnancées de la manière suivante :

- Nous établirons un contact initial avec le facilitateur pour identifier les profils adapté
- Nous rechercherons des profils adaptés à l'opération ainsi qu'aux fonctions supports de chaque cotraitant. Les missions confiées ne seront pas nécessairement en lien direct permanent avec l'opération, mais nous veillerons à ce que les profils retenus soient affectés à des tâches dédiées à l'opération, couvrant au moins 15% de leur temps de travail.

Elargissement du périmètre de recherche de profils dans cet ordre de priorité :

- Si les recherches avec le facilitateur n'aboutissent pas, nous ferons appel à un cabinet d'intérim spécialisé en insertion, qu'il soit associatif ou lucratif.

Nous effectuerons un travail continu de recherche de profils, en privilégiant ceux entrant dans le cadre de la clause d'insertion pour l'embauche. Nous communiquerons mensuellement au facilitateur et à la référente Insertion deux tableaux pendant toute la durée de l'opération :

- Ce tableau répertoriera tous les profils contactés, ayant effectué un entretien avec les ressources humaines de chaque cotraitant, ainsi que ceux retenus ou non, avec les raisons justifiant le choix des recruteurs.
- Tableau de Suivi des Heures d'Insertion : Ce tableau répertoriera les informations demandées au CCAP.

Cette approche structurée et collaborative nous permettra de répondre efficacement aux exigences d'insertion tout en assurant la réussite de l'opération.

6.2.Labels

- Le label NF HABITAT BBC 2024 est demandé.

Nous adapterons nos prescriptions afin d'obtenir le label cité ci-dessus.

Dans la rédaction des CCTP nous établirons les obligations de résultats explicitement aux entreprises.

Nous fournirons l'assistance nécessaire au maître d'ouvrage et toutes les démarches nécessaires pour obtenir la certification demandées.

A ce titre, nous fournirons les documents demandés par le certificateur, tant pendant la conception de l'opération que pendant les travaux (y compris pendant la visite sur site du certificateur)

6.3.Proposition Honoraires

Notre proposition d'honoraires est basée sur les paramètres suivants :

- Passation des marchés de travaux en entreprise générale ou en macro-lots en un seul appel d'offre
- Tranche 1 : Temps de chantier de 18 mois avec réception en fin de phase
- Tranche 2 : Temps de chantier 6 mois avec réception en fin de phase
- Les deux tranches de travaux sont passées dans un marché unique pour l'entreprise générale ou pour les entreprises en macro-lots
- La mission PEMD est valorisé à part du calcul en % puis sera réintégrée au tableau de l'AE

Le découpage de l'opération en deux phases, ajoute de la complexité aux études et prolonge la durée du chantier, ce qui impacte le taux global des honoraires.

La mission PEMD est également indépendante de l'étude de MOE et valorisée comme telle.

Vous trouverez ci-dessous le tableau détaillant notre proposition en deux phase plus le PEMD.

Le tableau de l'acte d'engagement regroupe les deux phases en une seule et intègre les études PEMD au BET Pouget Consultant.

TOTAL TRAVAUX HT		2 716 000 €							
ÉLÉMENTS	%	TOTAL HT	RÉPARTITION PAR COTRAITANT						
DE	sur	GLOBAL	KHORA		IPC		POUGET		
MISSION	honoraires		%	€	%	€	%	€	PEMD
DIAG	12,00 %	25 000 €	35,9 %	8 986 €	36,60 %	9 151 €	27,45 %	6 863 €	6 500 €
APS	11,00 %	23 000 €	41,2 %	9 484 €	34,45 %	7 923 €	24,32 %	5 593 €	1 000 €
APD	11,00 %	23 000 €	46,3 %	10 649 €	34,45 %	7 923 €	19,25 %	4 428 €	1 000 €
PC	2,50 %	5 000 €	85,2 %	4 260 €			14,80 %	740 €	
PRO	12,00 %	25 000 €	35,9 %	8 985 €	44,74 %	11 185 €	19,32 %	4 830 €	1 000 €
ACT	3,50 %	7 400 €	10,8 %	802 €	70,14 %	5 190 €	19,03 %	1 408 €	
VISA Tranche 1	4,00 %	8 400 €	49,5 %	4 156 €	17,86 %	1 500 €	32,67 %	2 744 €	1 000 €
DET Tranche 1	40,00 %	84 000 €	72,0 %	60 489 €	15,13 %	12 711 €	12,86 %	10 800 €	1 000 €
AOR Tranche 1	4,00 %	8 000 €	79,4 %	6 353 €	6,25 %	500 €	14,34 %	1 147 €	1 500 €
TOTAL BASE (DET 1)	7,69 %	208 800 €	53,23 %	114 164 €	20,00 %	56083 €	26,78 %	38553 €	
TRANCHE TRAVAUX 2 - pour une durée de 6 mois									
VISA Tranche 2		5000 €		3500 €				1500 €	500 €
DET Tranche 2		23250 €		21750 €				1500 €	500 €
AOR Tranche 2		3 000 €		3000 €					1 000 €
TOTAL TRAVAUX phase 2	1,15 %	31250 €		28250 €				3000 €	
TOTAL BASE (DET 1+2)	8,84 %	240 050 €		142414 €				41553 €	
PEMD	0,55 %	15 000 €							15 000 €
TOTAL BASE + DET 1+2 + PEMD	9,39 %	255 050 €		142414 €		56083 €			56553 €
OPC	1,5 %	40 740 €			100,00 %	40 740,00 €			
